



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Terça-feira • 09 de novembro de 2021 • Ano V • Edição Nº 1013



QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	2
EXTRATO (CONTRATO Nº 186/2021)	2
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (CREDENCIAMENTO Nº 004/2021)	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6
ATOS OFICIAIS	6
PORTARIA (Nº 286/2021)	6
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7
CONTAS PÚBLICAS	7
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1577/2021)	7
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 504/2021)	70

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO

<http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 186/2021)



PREFEITURA
XIQUE-XIQUE
TRABALHO SÉRIO, FUTURO CERTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE - BA
CNPJ Nº 13.880.257/0001-27
EXTRATO DO CONTRATO

CRENCIAMENTO Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2021
CONTRATO Nº 186/2021.

Contratante: MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA.

Objeto a ser contratado: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviço de hospedagem para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Xique-Xique/BA.

Favorecido: POUSADA MACEDO LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.122.432/0001-07.

Vigência: 03/11/2021 até 31/12/2021.

Valores Unitários:

CÓD	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA - QUARTO COM SANITÁRIO, AR CONDICIONADO, TV, ESTACIONAMENTO, FRIGOBAR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	305	R\$ 80,00	R\$ 24.400,00
2	HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA - QUARTO COM SANITÁRIO, VENTILADOR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	305	R\$ 50,00	R\$ 15.250,00
3	HOSPEDAGEM PARA 2 PESSOAS - QUARTO COM SANITÁRIO, AR CONDICIONADO, TV, ESTACIONAMENTO, FRIGOBAR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	100	R\$132,50	R\$ 13.250,00
4	HOSPEDAGEM PARA 2 PESSOAS - QUARTO COM SANITÁRIO, VENTILADOR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	100	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00
5	HOSPEDAGEM PARA 3 PESSOAS - QUARTO COM SANITÁRIO, AR CONDICIONADO, TV, ESTACIONAMENTO, FRIGOBAR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	50	R\$ 180,00	R\$ 9.000,00
6	HOSPEDAGEM PARA 3 PESSOAS - QUARTO COM SANITÁRIO, VENTILADOR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	50	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
7	HOSPEDAGEM PARA CASAL - QUARTO COM SANITÁRIO, AR CONDICIONADO, TV, ESTACIONAMENTO, FRIGOBAR E CAFÉ DA	DI	78	R\$ 132,50	R\$ 10.335,00

CNPJ: 13.880.257/0001-27
Endereço: Edifício José Peregrino - Praça Dom
Máximo, 384,
Centro - CEP: 47.400-000

Telefone: (74) 3661-4364
E-mail: contato@xiquexique.ba.gov.br
www.xiquexique.ba.gov.br



	MANHÃ.				
8	HOSPEDAGEM PARA CASAL - QUARTO COM SANITÁRIO, VENTILADOR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	78	R\$ 90,00	R\$ 7.020,00

Dotação Orçamentária:

ORGÃO: 8 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 801- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 2007 MANUT. DOS SERV. TÉCNICOS E ADM.
ELEMENTO DE DESPESA: 33903.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 01

ORGÃO: 6 – SECRETARIA ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE: 601 – SEC. ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PROJETO ATIVIDADE: 2007 – MANUTENÇÃO DE SERV. TEC. E ADM
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 00

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 2007 – MANUT. DOS SERV. TEC. E ADMINISTRATIVOS.
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 00/29

ORGÃO: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 0701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 2007 – MANUT. DOS SERV. TEC. E ADMINISTRATIVOS.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 2/14

Fundamento Legal: art. 25, INC II, art. 13, INC III e art. 26, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações).

Xique-Xique, Bahia, 03 de Novembro de 2021.

Reinaldo Teixeira Braga Filho
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.880.257/0001-27
Endereço: Edifício José Peregrino - Praça Dom
Máximo, 384,
Centro - CEP: 47.400-000

Telefone: (74) 3661-4364
E-mail: contato@xiquexique.ba.gov.br
www.xiquexique.ba.gov.br

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (CREDENCIAMENTO Nº 004/2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE - BA
CNPJ Nº 13.880.257/0001-27
CREDENCIAMENTO Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 264/2021

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO prevê o CREDENCIAMENTO em conformidade ao disposto no art. 25, caput, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, CONSIDERANDO ainda que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, **RATIFICO E HOMOLOGO O CREDENCIAMENTO 004/2021.**

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviço de hospedagem para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Xique-Xique/BA.

Favorecido: Pousada Macedo Ltda, inscrita no CNPJ nº 31.122.432/0001-07.

Vigência: 03/11/2021 até 31/12/2021.

Valores Unitários Estimados:

CÓD	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA - QUARTO COM SANITÁRIO, AR CONDICIONADO, TV, ESTACIONAMENTO, FRIGOBAR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	305	R\$ 80,00	R\$ 24.400,00
2	HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA - QUARTO COM SANITÁRIO, VENTILADOR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	305	R\$ 50,00	R\$ 15.250,00
3	HOSPEDAGEM PARA 2 PESSOAS - QUARTO COM SANITÁRIO, AR CONDICIONADO, TV, ESTACIONAMENTO, FRIGOBAR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	100	R\$132,50	R\$ 13.250,00
4	HOSPEDAGEM PARA 2 PESSOAS - QUARTO COM SANITÁRIO, VENTILADOR E	DI	100	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00

CNPJ: 13.880.257/0001-27
Endereço: Edifício José Peregrino - Praça Dom Máximo, 384, Centro - CEP: 47.400-000

Telefone: (74) 3661-4364
E-mail: contato@xiquexique.ba.gov.br
www.xiquexique.ba.gov.br



	CAFÉ DA MANHÃ.				
5	HOSPEDAGEM PARA 3 PESSOAS - QUARTO COM SANITÁRIO, AR CONDICIONADO, TV, ESTACIONAMENTO, FRIGOBAR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	50	R\$ 180,00	R\$ 9.000,00
6	HOSPEDAGEM PARA 3 PESSOAS - QUARTO COM SANITÁRIO, VENTILADOR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	50	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
7	HOSPEDAGEM PARA CASAL - QUARTO COM SANITÁRIO, AR CONDICIONADO, TV, ESTACIONAMENTO, FRIGOBAR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	78	R\$ 132,50	R\$ 10.335,00
8	HOSPEDAGEM PARA CASAL - QUARTO COM SANITÁRIO, VENTILADOR E CAFÉ DA MANHÃ.	DI	78	R\$ 90,00	R\$ 7.020,00

Fundamento Legal: art. 25, INC II, art. 13, INC III e art. 26, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Xique-Xique, Bahia, 03 de Novembro de 2021.

Reinaldo Teixeira Braga Filho
PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 286/2021)



**PREFEITURA
XIQUE-XIQUE**
TRABALHO SÉRIO, FUTURO CERTO.

SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA 286 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

Nomeia **VANESSA LIMA DOS SANTOS** para o cargo de Coordenador (a) Escolar – Porte G, do Colégio Municipal Esdras Rocha e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA do Município de Xique-Xique, Estado da Bahia, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 153, de 04 de fevereiro de 2021,


RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **VANESSA LIMA DOS SANTOS** para o cargo de Coordenador (a) Escolar – Porte G, carga horária 20 horas, do Colégio Municipal Esdras Rocha.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Xique-Xique, 09 de novembro de 2021.



Dr. ADONIRÁN OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal da Educação e Cultura
Dec. nº 004/2021

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1577/2021)



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

NOVEMBRO/2021

Processo Pagamento: **1577** Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% Data: 05/11/2021

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM Compl: ANDAR 1
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: varcon@varcon.com.br Telefone: (74)3661-1596 RG: 00000000000000000000

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905102 Obras e Instalações (material)
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 33 OBRAS E INSTALAÇÕES

Licitação: Nº CC003/2021 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
371	31/03/2021	9.646,01	9.646,01	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 028 - 4ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
4 - 04/11/2021	9.646,01


Retenção	Valor
----------	-------


NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	9.646,01

Data: 05/11/2021 Conta: 186864 - FMS - Recursos Próprios/Saúde 15%

Autorização de Débito: 001


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

NOVEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 4 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% Data: 04/11/2021

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM Compl: ANDAR 1
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: varcon@varcon.com.br Telefone: (74)3661-1596 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905102 Obras e Instalações (material)
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 33 OBRAS E INSTALAÇÕES

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
371	31/03/2021	9.646,01	9.646,01	0.00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 028 - 4ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal (028 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 24/09/2021)	9.646,01

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.646,01

NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	9.646,01



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

NOVEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 4	Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Data: 04/11/2021
------------------------------	---	-------------------------

Data: 04/11/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E
PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

NOVEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 4 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% Data: 04/11/2021

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM Compl: ANDAR 1
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: varcon@varcon.com.br Telefone: (74)3661-1596 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905101 Obras e Instalações (mão de Obra)
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 33 OBRAS E INSTALAÇÕES

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
266	31/03/2021	6.430,68	6.430,68	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE.. CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 028 - 4ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE.. CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal (028 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 24/09/2021)	6.430,68

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.430,68

Retenção	Valor
2188101080001-ISS a Recolher	128,61

SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Total Retido:	128,61
Total Líquido:	6.302,07



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

NOVEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 4	Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Data: 04/11/2021
-----------------------	--	------------------

Data: 04/11/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E
PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho **371** Tipo: Global Data: 31/03/2021

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM, 12
Bairro: CENTRO
E-mail: varcon@varcon.com.br
PIS/PASEP:
Compl: ANDAR 1
Cidade: Xique-Xique UF: BA
Telefone: (74)3661-1596
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905102 Obras e Instalações (material)
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 33 OBRAS E INSTALAÇÕES

Licitação: Nº CC003/2021 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
080 / 2021		Global	120.000,00	120.000,00	0,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19344 - OBRAS E INSTALAÇÕES	UND	1,0000	120.000,0000	120.000,0000

CENTO E VINTE MIL REAIS


120.000,00

Emitido em 31/03/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Reforço de Empenho

NOVEMBRO/2021

Processo Reforço 235 Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI **CNPJ/CPF:** 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM **Compl:** ANDAR 1
Bairro: CENTRO **Cidade:** Xique-Xique **UF:** BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações

Licitação: 35 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

EMPENHO ALTERADO

EMPENHO ALTERADO				SALDO ANTERIOR	VALOR REFORÇO	SALDO DISPONÍVEL
Nº	TIPO	EMIÇÃO	CONTRATO	120.000,00	9.047,04	129.047,04
371	Global	31/03/2021	080/2021			

HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO.

NOVE MIL E QUARENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

9.047,04

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	OBRAS E INSTALAÇÕES	UND	1,00	120.000,00	120.000,00

CENTO E VINTE MIL REAIS

120.000,00

Data: 04/11/2021

Autorizo a ALTERAÇÃO do empenho

Este Reforço foi processada de acordo com a legislação vigente

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE

PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho

MARÇO/2021

Nota de Empenho: 266 Tipo: Global Data: 31/03/2021

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM, 12
Bairro: CENTRO
E-mail: varcon@varcon.com.br
PIS/PASEP:
Compl: ANDAR 1
Cidade: Xique-Xique UF: BA
Telefone: (74)3661-1596
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905101 Obras e Instalações (mão de Obra)
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 33 OBRAS E INSTALAÇÕES

Licitação: Nº CC003/2021 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
080 / 2021		Global	200.000,00	80.000,00	120.000,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19413 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	UND	1,0000	80.000,0000	80.000,0000

OITENTA MIL REAIS


80.000,00

Emitido em 31/03/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Reforço de Empenho

NOVEMBRO/2021

Processo Reforço 234 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI **CNPJ/CPF:** 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM **Compl:** ANDAR 1
Bairro: CENTRO **Cidade:** Xique-Xique **UF:** BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações

Licitação: 35 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

EMPENHO ALTERADO				SALDO ANTERIOR	VALOR REFORÇO	SALDO DISPONÍVEL
Nº	TIPO	EMIÇÃO	CONTRATO	80.000,00	5.698,04	85.698,04
266	Global	31/03/2021	080/2021			

HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO.

CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

5.698,04

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	UND	1,00	80.000,00	80.000,00

OITENTA MIL REAIS

80.000,00

Data: 04/11/2021

Autorizo a ALTERAÇÃO do empenho

Este Reforço foi processada de acordo com a legislação vigente

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE
CNPJ nº 13.880.257/0001-27, Praça Don Máximo, 384, Sede, CENTRO, CEP 47.400-000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica - Série A1

Número: 28
24/09/2021

Cód. Verificação

5T5952949

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: **M.V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**
CNPJ: **33.564.387/0001-68** Inscrição Estadual: Insccrição Municipal: **5.4.001681**
Endereço: RUA SILVA JARDIM, 12, ANDAR 1, CENTRO, CEP 47.400-000
Município: Xique-Xique UF: Bahia

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**
CNPJ: **13.880.257/0001-27** Inscrição Estadual:
Endereço: Praça Don Máximo, 384, Sede, CENTRO, CEP 47.400-000
Município: Xique-Xique UF: Bahia

Código do Serviço (Lei Complementar nº 116/2003)

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 080/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA., CONFORME CARTA-CONVITE 003/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 101/2021. FIMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE E A EMPRESA M.V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI.
MATERIAL (60%): R\$ 9.646,01- MÃO DE OBRA (40%): R\$ 6.430,68.
VALOR TOTAL: R\$ 16.076,69.

DADOS BANCÁRIOS:
EMPRESA: M V ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

BANCO SANTANDER
AG: 2328
CONTA: 00013000805-0
CNPJ: 33.564.387/001-68

ITENS DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
Material utilizado na Obra	un	1	9.646,01	9.646,01
Serviços de obras de Construção Civil	un	1	6.430,68	6.430,68



VALOR TOTAL DA NOTA: 16.076,69

PIS: 0,00	COFINS: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	CSLL: 0,00	Base de Cálculos: 6.430,68
Optante Simples: Sim	Alíquota ISS: 2,00%	Valor ISS: 128,61	Valor Líquido: 15.948,08		
A autenticidade desta Nota Fiscal está sujeita a verificação. Para isso, acesso o site www.xiquexique.ba.gov.br e informe o código de verificação da nota fiscal.					

BCD Sistemas (74) 3641-4465

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE				SOLISTIM DE MEDIÇÃO Nº 04						
Praça Dom Máximo, 384, centro - Xique-Xique/BA. CEP: 47.400-000						PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/06/21 à 14/07/21						
CONTRATADA: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.				ART Nº: BA20210498455			INÍCIO: 31/03/2021			
						CC Nº: 003/2021			TOTAL CONTRATADO: R\$ 316.745,08			
						CONTRATO Nº: 080/2021			MED. ANTERIORES: R\$ 300.668,39			
						PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES			SALDO: R\$ 16.076,69			
						ADITIVO DE PRAZO:			MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 16.076,69			
						TERMINO PREVISTO: 31/03/2022			SALDO GERAL: R\$ 0,00			
Nº	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇOS				QUANTIDADES			VALORES			
		Unid.	Quant.	Val. Unit.	Val. Total	Quant.	Medição	Valor	Quant.	Medição	Valor	Saldo Geral
SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	21,20	23,18	R\$ 491,42	21,20					491,42	
1.2	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	7,20	8,28	R\$ 59,62	7,20					59,62	
1.3	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	4,90	11,94	R\$ 58,51	4,90					58,51	
		Subtotal									58,51	
MOVIMENTO DE TERRA/CARGAS E TRANSPORTES												
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	3,68		R\$ 33,33	3,68					122,66	
2.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m³	42,13		R\$ 27,63	42,13					1.164,11	
		Subtotal									1.286,77	
FUNDAÇÃO												
3.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	23,48		R\$ 52,65	23,48					1.236,05	
3.2	Apo CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	239,93		R\$ 8,11	239,93					1.945,83	
3.3	Apo CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	64,79		R\$ 7,52	64,79					487,22	
3.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	6,64		R\$ 426,83	6,64					2.834,15	
		Subtotal									6.503,25	
ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA												
4.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	35,97		R\$ 52,65	35,97					1.893,82	
4.2	Apo CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	321,44		R\$ 8,11	321,44					2.606,88	
4.3	Apo CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	114,12		R\$ 7,52	114,12					858,18	
4.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	4,86		R\$ 426,83	4,86					2.074,39	
		Subtotal									7.433,27	
ALVENARIAS DE FECHAMENTO												
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m²	264,96		R\$ 49,80	264,96					13.195,01	
		Subtotal									13.195,01	
LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS												
6.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	23,95		R\$ 114,00	23,95					2.730,30	
6.1	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m²	23,95		R\$ 42,55	23,95		23,95			1.019,07	0,00
		Subtotal									1.019,07	1.019,07
REVESTIMENTO DE PAREDE/ACABAMENTO												
7.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	529,92		R\$ 5,79	529,92					3.068,24	
7.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	529,92		R\$ 33,75	529,92					17.885,81	
7.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura interla das paredes. af_06/2014	m²	176,57		R\$ 325,08	176,57					6.925,08	

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
Secretário Municipal de S
Decreto 003/2021

ABIMAR SOUTERO BARBOSA
Engenheiro Civil
CREA: 9080487
MATRICULA: 7851



MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-11
Resp. Tec. Michael A. V.
Eng. Civil CREA/BA: 11.111

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Praça Dom Máximo, 384, centro - Xique-Xique/BA. CEP: 47.400-000				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/06/21 à 14/07/21		ART Nº: BA20210498455 CC Nº: 003/2021 CONTRATO Nº: 080/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES ADITIVO DE PRAZO: TERMINO PREVISTO: 31/03/2022			INÍCIO: 31/03/2021 TOTAL CONTRATADO: R\$ 316.745,08 MED. ATÉRIORES: R\$ 300.668,39 SALDO: R\$ 16.076,69 MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 16.076,69 SALDO GERAL: R\$ 0,00					
CONTRATADA : M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI														
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.														
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PROPOSTA				QUANTIDADES				VALORES				
		UNID	QUANT	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	SALDO	MEDIÇÃO	SALDO GERAL	ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	SALDO	MEDIÇÃO	SALDO GERAL	
7.4	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm	m²	176,57	R\$ 6,07	R\$ 1.071,78	176,57						1.071,78		
REVESTIMENTO DE PISO					Subtotal				R\$ 28.350,91					
8.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	47,11	R\$ 326,78	R\$ 15.394,61	47,11						15.394,61		
8.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	27,82	R\$ 14,71	R\$ 409,23	27,82						409,23		
8.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014	m²	27,82	R\$ 44,04	R\$ 1.225,19	27,82						1.225,19		
8.4	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	50,96	R\$ 39,26	R\$ 2.000,69	50,96						2.000,69		
8.5	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	50,96	R\$ 14,68	R\$ 748,09		50,96	50,96				748,09	748,09	0,00
8.6	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm	m²	27,82	R\$ 7,03	R\$ 195,57	27,82						195,57		
8.7	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m²	8,90	R\$ 258,30	R\$ 2.298,87	8,90						2.298,87		
8.8	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016	M	44,40	R\$ 21,11	R\$ 937,28	44,40						937,28		
8.9	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	9,90	R\$ 62,87	R\$ 622,41	9,90						622,41		
8.10	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	197,27	R\$ 11,54	R\$ 2.276,50	197,27						2.276,50		
8.11	Verniz sintético brilhante, 2 demãos	m²	197,27	R\$ 10,03	R\$ 1.978,62	197,27						1.978,62		
Subtotal					R\$ 28.087,06				748,09 748,09 0,00					
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS														
9.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo-fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	3,00	R\$ 460,91	R\$ 1.382,73	3,00						1.382,73		
9.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo-fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	6,00	R\$ 429,48	R\$ 2.576,88	3,00	3,00	3,00				1.288,44	1.288,44	1.288,44
9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo-fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	6,00	R\$ 365,12	R\$ 2.190,72	6,00						2.190,72		
9.4	Porta em madeira compensada (Virota), lisa, semi-oca, 160 x 210 cm, 2 folhas, tipo vai-vem, com visor(40x70cm), inclusive batentes e ferragens	UN	1,00	R\$ 878,19	R\$ 878,19	1,00						878,19		
9.5	Bate maca de 800x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	UN	4,00	R\$ 43,29	R\$ 173,16	4,00						173,16		
9.6	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	5,67	R\$ 390,24	R\$ 2.212,66	5,67						2.212,66		
9.7	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm	m²	6,05	R\$ 269,54	R\$ 1.630,72		6,05	6,05				1.630,72	1.630,72	0,00
9.8	Janela em alumínio, cor fosca, tipo basculante, completa, exclusive vidros	m²	2,10	R\$ 268,67	R\$ 564,21	2,10						564,21	1.630,72	1.630,72
Subtotal					R\$ 11.609,27				2.919,16 2.919,16 0,00					
PINTURA														
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	506,61	R\$ 2,10	R\$ 1.063,88	448,92	57,69	57,69				942,73	121,15	121,15
10.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev D1	m²	506,61	R\$ 13,00	R\$ 6.585,93	448,92	57,69	57,69				5.835,96	749,97	749,97
10.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	506,61	R\$ 11,40	R\$ 5.775,35	304,05	202,56	202,56				3.466,17	2.309,18	2.309,18
10.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	13,82	R\$ 14,17	R\$ 195,83		13,82	13,82				195,83	195,83	0,00

ABINAI SOTERO BARBOSA
Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto-003/2021

MV ENGENHARIA
CNPJ 33.564.987/0001-00
Resp. Tec. Michel A. Varral
Eng. Civil CREA/BA: 931

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Praça Dom Máximo, 384, centro - Xique-Xique/BA. CEP: 47.400-000				 MV ENGENHARIA Construções e Reformas				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/06/21 à 14/07/21						
CONTRATADA : M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.				ART Nº: BA20210498455 CC Nº: 003/2021 CONTRATO Nº: 080/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES ADITIVO DE PRAZO: TERMINO PREVISTO: 31/03/2022				INÍCIO: 31/03/2021 TOTAL CONTRATADO: R\$ 316.745,08 MED. ANTERIORES: R\$ 300.668,39 SALDO: R\$ 16.076,69 MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 16.076,69 SALDO GERAL: R\$ 0,00						
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PROPOSTO		QUANTIDADES			VALORES							
		UNID	QTD	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	SALDO	MEDIÇÃO 00	SALDO GERAL	ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	SALDO	MEDIÇÃO 00	SALDO GERAL	
10.5	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	23,31	R\$ 19,40	R\$ 452,21	3,78	19,53	19,53			73,33	378,88	378,88	0,00
				Subtotal	R\$ 14.073,20						3.755,01	3.755,01	3.755,01	0,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/PLUVIAIS													
11.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido rosçável Ø 3/4"	un	5,00	R\$ 98,77	R\$ 493,85	5,00					493,85			
11.2	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	6,00	R\$ 99,95	R\$ 599,70	6,00					599,70			
11.3	Registro de pressão bruto, latão, rosçável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	9,00	R\$ 41,85	R\$ 376,65	9,00					376,65			
11.4	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	2,00	R\$ 32,04	R\$ 64,08	2,00					64,08			
11.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ratos sifonados, etc.)	un	4,00	R\$ 48,45	R\$ 193,80	4,00					193,80			
11.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00	R\$ 64,81	R\$ 259,24	4,00					259,24			
11.7	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SPI3 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	4,00	R\$ 186,78	R\$ 747,12	2,00		2,00			373,56	373,56	373,56	
11.8	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	4,00	R\$ 137,87	R\$ 551,48	2,00		2,00			275,74	275,74	275,74	
11.9	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha -fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	7,00	R\$ 41,45	R\$ 290,15	2,00		5,00			82,90	207,25	207,25	
11.10	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1,00	R\$ 2.352,83	R\$ 2.352,83	1,00					2.352,83			
11.11	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1,00	R\$ 1.254,10	R\$ 1.254,10	1,00					1.254,10			
11.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	79,25	R\$ 15,27	R\$ 1.210,15	79,25					1.210,15			
11.13	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	60,75	R\$ 20,21	R\$ 1.227,76	60,75					1.227,76			
11.14	TE, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	5,00	R\$ 9,03	R\$ 45,15	5,00					45,15			
11.15	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	M	62,30	R\$ 6,13	R\$ 381,90	62,30					381,90			
11.16	TE de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	7,00	R\$ 13,56	R\$ 94,92	7,00					94,92			
11.17	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	46,75	R\$ 8,61	R\$ 402,52	46,75					402,52			
11.18	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	5,00	R\$ 9,21	R\$ 46,05	5,00					46,05			
11.19	TE, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	4,00	R\$ 5,21	R\$ 20,84	4,00					20,84			
11.20	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	8,00	R\$ 4,93	R\$ 39,44	8,00					39,44			
11.21	Curva em cobre, dn 22 mm, 45 graus, sem anel de solda, bolsa x bolsa, instalado em ramal de distribuição -fornecimento e instalação. af_01/2016	UN	6,00	R\$ 14,85	R\$ 89,10	6,00					89,10			
11.22	Chuveiro plástico sem registro	un	8,00	R\$ 16,71	R\$ 133,68									
11.23	Rato sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	13,00	R\$ 8,72	R\$ 113,36	13,00					113,36			
11.24	Rato seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	9,00	R\$ 8,55	R\$ 76,95	9,00					76,95			
				Subtotal	R\$ 11.064,82						990,23	990,23	990,23	

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde
Secretário 003/2021

ASIMUEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 9060484
MATRÍCULA: 7851



MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.584.387/0001-69
Res. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE					FIGURAS DE MEDIÇÃO Nº 04								
Praça Dom Máximo, 384, centro - Xique-Xique/BA. CEP: 47.400-000					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/06/21 à 14/07/21								
CONTRATADA : M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					ART Nº: BA20210498453			INÍCIO: 31/03/2021		TOTAL CONTRATADO: R\$ 316.745,08			
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					CC Nº: 003/2021			MÉD. ATERIORES: R\$ 300.668,39		SALDO: R\$ 16.076,69			
					PRazo DE EXECUÇÃO: 12 MESES			ADITIVO DE PRAZO:		MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 16.076,69			
					TERMINO PREVISTO: 31/03/2022			SALDO GERAL: R\$ 0,00					
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	PROPOSTA			QUANTIDADES				VALORES				
		Unid	Quant	Val Unit	Val Total	ANULADO DO TYPORRE ANTERIORES	SALDO	MEDIÇÃO 04	SALDO GERAL	ACUMULADO DO ANTERIORES	SALDO	MEDIÇÃO 04	SALDO GERAL
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO												
12.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,00	R\$ 99,61	R\$ 99,61		1,00	1,00					
12.2	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	2,00	R\$ 78,50	R\$ 157,00	2,00				157,00	99,61	99,61	
12.3	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	5,00	R\$ 64,47	R\$ 322,35	5,00				322,35			
12.4	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	5,00	R\$ 48,35	R\$ 241,75	5,00				241,75			
12.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	5,00	R\$ 11,73	R\$ 58,65		5,00	5,00			58,65	58,65	
12.6	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	94,50	R\$ 8,01	R\$ 756,95	94,50				756,95			
12.7	Calha de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - rev 01	un	41,00	R\$ 10,99	R\$ 450,59	41,00				450,59			
12.8	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	200,00	R\$ 2,77	R\$ 554,00	200,00				554,00			
12.9	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	150,00	R\$ 4,42	R\$ 663,00	150,00				663,00			
12.10	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	440,00	R\$ 6,02	R\$ 2.648,80	440,00				2.648,80			
12.11	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	100,00	R\$ 9,29	R\$ 929,00	100,00				929,00			
12.12	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	14,00	R\$ 20,51	R\$ 287,14		14,00	14,00			287,14	287,14	
12.13	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	5,00	R\$ 34,02	R\$ 170,10		5,00	5,00			170,10	170,10	
12.14	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	12,00	R\$ 40,63	R\$ 487,56		12,00	12,00			487,56	487,56	
12.15	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	10,00	R\$ 21,61	R\$ 216,10		10,00	10,00			216,10	216,10	
12.16	Tomada 2p + t, abnt, de sobrepor, 10 a	un	60,00	R\$ 12,77	R\$ 766,20	60,00				766,20			
12.17	Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 20a - 220v	un	40,00	R\$ 40,99	R\$ 1.639,60	40,00				1.639,60			
12.18	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	52,00	R\$ 34,79	R\$ 1.809,08	23,00	29,00	29,00		800,17	1.008,91	1.008,91	
12.19	Fornecimento e instalação de canaleta plástica dip 32x20x2000 mm (ref 300 17 pial legrand ou similar)	un	60,00	R\$ 31,55	R\$ 1.893,00	60,00				1.893,00			
12.19	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" balco (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	17,00	R\$ 8,58	R\$ 145,86	17,00							
				Subtotal	R\$ 14.296,34						2.328,07	2.328,07	
13	COBERTURAS/BOARDS												
13.1	Fôrro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	153,09	R\$ 39,33	R\$ 6.021,03	153,09				6.021,03			
13.2	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, taboana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	174,55	R\$ 73,10	R\$ 12.759,61	174,55				12.759,61			
13.3	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	152,06	R\$ 76,72	R\$ 11.666,04	152,06				11.666,04			
13.4	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	48,95	R\$ 15,07	R\$ 737,68		48,95	48,95			737,68	737,68	0,00
13.5	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	22,00		R\$ 56,52	R\$ 1.243,44	22,00				1.243,44			

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 003/2021


MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.562.700/04-88
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058


 PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Praça Dom Máximo, 384, centro - Xique-Xique/BA. CEP: 47.400-000				 MV ENGENHARIA Construções e Reformas				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/06/21 à 14/07/21													
CONTRATADA : M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.				ART Nº: BA20210498455 CC Nº: 003/2021 CONTRATO Nº: 080/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES ADITIVO DE PRAZO: TERMINO PREVISTO: 31/03/2022				INÍCIO: 31/03/2021 TOTAL CONTRATADO: R\$ 316.745,08 MED. ANTERIORES: R\$ 300.668,39 SALDO: R\$ 16.076,69 MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 16.076,69 SALDO GERAL: R\$ 0,00													
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PROPOSTO		QUANTIDADES			VALORES														
		Unid	Quant	Val Unit	Val Total	ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	SALDO	MEDIÇÃO 04	SALDO GERAL	ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	SALDO	MEDIÇÃO 04	SALDO GERAL								
14 INSTALAÇÃO DE GASES				Subtotal			R\$ 32.427,80			737,68			737,68			0,00					
14.1	Gases	Un	1,00	R\$ 58.450,03	R\$ 58.450,03	1,00															
15 EQUIPAMENTOS				Subtotal			R\$ 58.450,03														
15.1	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compressor rotativo	Un	2,00	R\$ 4.030,45	R\$ 8.060,90	2,00															
15.2	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 48000 btu/h c/ compressor rotativo	Un	2,00	R\$ 7.543,12	R\$ 15.086,24	2,00															
16 SERVIÇOS FINAIS				Subtotal			R\$ 23.147,14														
16.1	Limpeza geral	m²	479,00	R\$ 0,76	R\$ 364,04																
				Subtotal			R\$ 364,04			479,00			479,00								
				TOTAL S/BDI			R\$ 255.247,83						R\$ 12.861,35			R\$ 12.861,35			R\$ 0,00		
				TOTAL DE SERVIÇOS (BDI 25%)			R\$ 58.025,18						R\$ 3.215,34			R\$ 3.215,34			R\$ 0,00		
				TOTAL DE EQUIPAMENTOS (BDI 15%)			R\$ 3.472,07														
				TOTAL C/ BDI			R\$ 316.745,08						R\$ 16.076,69			R\$ 16.076,69			R\$ 0,00		


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

ABINAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 50604BA
MATRICULA: 7851

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-50
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93633

CADERNO DE DIÁRIOS DE OBRA					
	PROPRIETÁRIO:	Secretaria de Obras - Prefeitura Municipal de Xique-Xique			REV.
	EMPREENHIMENTO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20			FOLHA
	RESPONSÁVEL:	Diretoria de Infraestrutura - PMXX			1/31
DADOS CADASTRAIS:					
CONTRATO Nº:	080/2021				
EXECUTANTE:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI				
OBJETO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA.				
LOCAL:	RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					
Caderno de Diário de Obra referente ao mês de:			Maio/Junho de 2021		
DE:	15/06/2021	A	14/07/2021		
REV.	RESUMO DAS REVISÕES				
0	EMISSÃO INICIAL - Aprovação do Caderno de Diário de Obra Referente ao mês de maio/junho de 2021				
REVISÕES:	REV. 00	REV. 01	REV. 02	REV. 03	REV. 04
EMISSÃO DATA:	14/07/2021				
EXECUÇÃO:					
APROVAÇÃO:					


MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.864.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058


ADINIVAL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7801

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 076			
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	Junho		
31/03/2021		31/03/2022	365	76	289	SEMANA:	terça-feira		
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA		X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE		X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						0,00	Sexta Feira		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução do Polimento do piso de alta resistência.								
1.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014								
1.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. do Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	1	0	1	9,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	6	0	6	54,00	TOTAL	2	0	2	9,00
EQUIPAMENTOS		QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS	TOTAL EFETIVO		CONTROLE - CQ		
				0,00	MOD	6	VIAS:	3	
					MOI	2	DINF	2	
					TOTAL	8	EMPRESA	1	
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 04			
					Planejamento	DATA: 14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA				
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021				
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 077				
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	16/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	77	288		SEMANA:	Junho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.								
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHA		X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE		X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						0,00	Sexta Feira			
							07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE					
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.									
1.1	Execução do Polimento do piso de alta resistência.									
1.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014									
1.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01									
1.4										
1.5										
1.6										
1.7										
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA				MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA						
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas	
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00	
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00	
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00	
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00	
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00	
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00	
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00	
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00	
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00	
									0,00	
TOTAL	6	0	6	54,00	TOTAL	1	0	1	0,00	
EQUIPAMENTOS				QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS	TOTAL EFETIVO			
						0,00	CONTROLE - CQ			
							MOD	6	VIAS:	3
							MOI	1	DINF	2
							TOTAL	7	EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF					
ASS:					ASS:					
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX					
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 04 DATA: 14/07/2021				

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.469.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 930.3

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX									
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021		
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 079		
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	18/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	79	286	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO					SEMANA:	sexta-feira			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00			
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE			
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014								
1.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01								
1.3	Execução das instalações hidrossanitária pendentes, ajustes e modificações.								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	1	0	1	9,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	6	0	6	54,00	TOTAL	2	0	2	9,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS		TOTAL EFETIVO			CONTROLE - CQ	
				0,00	MOD	6		VIAS:	3
					MOI	2		DINF	2
					TOTAL	8		EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Rep. Fotográfico - Nº 04			
					Planejamento	DATA: 14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 931.

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 080			
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	19/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	80	285	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 26 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ		X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE		X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE							Sexta Feira		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014								
1.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 01								
1.3	Execução das instalações hidrossanitárias pendentes, ajustes e modificações.								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7	A contratada informa que trabalhamos até as 14 horas								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
									0,00
TOTAL	6	0	6	54,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO			CONTROLE - CQ	
				0,00	MOD	6		VIAS:	3
					MOI	1		DINF	2
					TOTAL	7		EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA /					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 04			
					Planejamento	DATA: 14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 38564387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº		080/2021		
LOCAL:		MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº.:		RDO-DINF-M.V.ENG. 081		
INÍCIO		TÉRMINO		PREVISTO		DECORRIDOS		RESTANTE	
31/03/2021		31/03/2022		365		81		284	
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI-INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM		CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM		PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS		DURAÇÃO	
MANHA		X						HORAS PARALISADAS	
TARDE		X						0,00	
NOITE								0,00	
ITEM		GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1		TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1		A contratada informa que não trabalhamos no dia 20/06/21 - Domingo							
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função		Efetivo Nom.		Faltas		Efetivo do dia		Horas	
Ajudante		0		0		0		0,00	
Pedreiro		0		0		0		0,00	
Armador		0		0		0		0,00	
Carpinteiro		0		0		0		0,00	
Pintor		0		0		0		0,00	
Eletricista		0		0		0		0,00	
Encanador		0		0		0		0,00	
Encarregado		0		0		0		0,00	
Serralheiro		0		0		0		0,00	
TOTAL		0		0		0		0,00	
EQUIPAMENTOS		QT		AQUISIÇÃO		DIARIAS		TOTAL EFETIVO	
								0,00	
								TOTAL EFETIVO	
								MOD 0	
								MOI 0	
								TOTAL 0	
								CONTROLE - CQ	
								VIAS: 3	
								DINF 2	
								EMPRESA 1	
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:		Elaborado Por:			Setor:		Reg. Fotográfico - Nº		04
		MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento		DATA:		14/07/2021

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tcc. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93038

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 082			
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	21/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	82	283	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ		X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE		X				0,00	Sexta Feira		
NOITE							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014								
1.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01								
1.3	Execução das instalações hidrossanitária pendentes, ajustes e modificações.								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	FaRas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	FaRas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
									0,00
									0,00
TOTAL	6	0	6	54,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO				
				0,00	MOD	6			3
					MOI	1			2
					TOTAL	7			1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.464.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 083			
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	22/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	83	282	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ		X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE		X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						0,00	Sexta Feirá		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014								
1.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01								
1.3	Execução das instalações hidrossanitára pendentes, ajustes e modificações.								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	6	0	6	54,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1	0,00
				0,00	TOTAL EFETIVO	CONTROLE - CQ			
					MOD	6	VIAS: 3		
					MOI	1	DINF 2		
					TOTAL	7	EMPRESA 1		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 04			
					Planejamento	DATA: 14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-63
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 930. .

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATR.CULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					M.V. ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 084			
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	23/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	84	281	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO					SEMANA:	quarta-feira			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00			
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
	MANHÃ	X			0,00	Segunda a Quinta			
	TARDE	X			0,00	07:00 hs as 17:00			
	NOITE				0,00	Sexta Feira 07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014								
1.2	Execução das instalações hídrossanitára pendentes, ajustes e modificações.								
1.3	Execução das instalações elétricas pendentes e modificações.								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	1	0	1	9,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	7	0	7	63,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS		TOTAL	1	0	1	0,00
			0,00		TOTAL EFETIVO				
					MOD	7		VIAS:	3
					MOI	1		DINF	2
					TOTAL	8		EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 085			
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	24/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	85	280	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO					SEMANA:	quinta-feira			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 às 17:00			
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X					0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X					0,00	Sexta Feira		
NOITE							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRETA				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. of_06/2014								
1.2	Execução das instalações hidrossanitára pendentes, ajustes e modificações.								
1.3	Execução das instalações elétricas pendentes e modificações.								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	1	0	1	9,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	7	0	7	63,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS	0,00	TOTAL EFETIVO	CONTROLE - CQ			
					MOD	7	VIAS: 3		
					MOI	1	DINF 2		
					TOTAL	8	EMPRESA 1		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ARIMAR SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 505048A
MATRICULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 086			
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	25/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	86	279	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ		X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE		X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						0,00	Sexta Feira		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014								
1.2	Execução das instalações hidrossanitária pendentes, ajustes e modificações.								
1.3	Execução das instalações elétricas pendentes e modificações.								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	1	0	1	9,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	7	0	7	63,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS	0,00	TOTAL EFETIVO	7	VIAS:	3	
					MOD	7	DINF	2	
					MOI	1	EMPRESA	1	
					TOTAL	8			
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ABIMAR SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 9960484
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI				Contrato Nº	080/2021		
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.				RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 087		
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	26/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	87	278	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X					0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X					0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE							Sexta Feira		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014								
1.2	Execução das instalações hidrossanitárias pendentes, ajustes e modificações.								
1.3	Execução das instalações elétricas pendentes e modificações.								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7	A contratada informa que trabalhou até as 14 horas.								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faixas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faixas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	3	0	3	27,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	1	0	1	9,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	7	0	7	63,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1	0,00
				0,00	TOTAL EFETIVO				CONTROL - CQ
					MOD	7			VIAS:
					MOI	1			DINF
					TOTAL	8			EMPRESA
									1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 31.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

ABIMAR COSTA BARBOSA
CREA: 90604RA
CREA: 90604RA
Nº: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 088			
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	Junho			
31/03/2021	31/03/2022	365	88	277	SEMANA:	domingo			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
	MANHÃ	X			0,00	Segunda a Quinta			
	TARDE	X			0,00	07:00 hs as 17:00			
	NOITE				0,00	Sexta Feira 07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	A contratada informa que não realizamos serviços no dia 27/06/21 - Domingo.								
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	0	0	0	0,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	0	0	0	0,00	Fiscal - Obra	0	0	0	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	0	0	0	0,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	0	0	0	0,00
			0,00		TOTAL EFETIVO				
					MOD	0			VIAS: 3
					MOI	0			DINF 2
					TOTAL	0			EMPRESA 1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.664.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93024

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 996048A
ATRIBUIÇÃO: 02/1

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 089			
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	Junho		
31/03/2021		31/03/2022	365	89	276	SEMANA:	segunda-feira		
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ		X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE		X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						0,00	Sexta Feira		
						0,00	07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Instalação Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e								
1.2	Execução do Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	4	0	4	36,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS		QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS	TOTAL EFETIVO		CONTROLE - CQ		
				0,00	MOD	4	VIAS:		3
					MOI	1	DINF		2
					TOTAL	5	EMPRESA		1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 04 DATA: 14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.562.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

ABRAÃO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7254

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 080			
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	29/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	90	275		SEMANA:	Junho		
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ		X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE		X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						0,00	Sexta Feira		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Instalação Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e								
1.2	Execução do Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
									0,00
									0,00
									0,00
TOTAL	4	0	4	36,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL				
				0,00					
					TOTAL EFETIVO			CONTROLE - CQ	
					MOD	4		VIAS:	3
					MOI	1		DINF	2
					TOTAL	5		EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 04			
					Planejamento	DATA: 14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.584.387/0001-63
Resp. Tec. Michael A. Varg...

ASSUNÇÃO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 916011A
REC. 1151

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX									
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021				
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 092				
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	01/07/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	92	273	PERÍODO:	Julho			
ESCOPO	CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI-INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.								
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE					0,00	Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Instalação Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e								
1.2	Execução do Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
									0,00
TOTAL	4	0	4	36,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS	0,00	TOTAL	1	0	1	0,00
					TOTAL EFETIVO	CONTROLE - CQ			
					MOD	4	VIAS:		
					MOI	1	DINF		
					TOTAL	5	EMPRESA		
							1		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº	04			
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:	14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 32.569.387/0001-03
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 930

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 906041A
MATRÍCULA: 7651

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 093			
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	02/07/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	93	272		Semana:	Juho		
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X					0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X					0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						0,00	Sexta Feira		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Instalação Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e								
1.2	Execução do Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
									0,00
									0,00
									0,00
TOTAL	4	0	4	36,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS		QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS	TOTAL EFETIVO		CONTROLE - CQ		
				0,00	MOD	4	VIAS: 3		
					MOI	1	DINF 2		
					TOTAL	5	EMPRESA 1		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.664.387/0001-63
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93000

ABRAHAM SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604RA

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 094			
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	Julho		
31/03/2021		31/03/2022	365	94	271	SEMANA:	sábado		
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA		X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE		X				0,00	Sexta Feira		
NOITE						0,00	07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Instalação Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e								
1.2	Execução do Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7	A contratada informa que trabalhamos até as 14 horas								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	4	0	4	36,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS		QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS	TOTAL EFETIVO		CONTROLE - CQ		
				0,00	MOD	4	VIAS: 3		
					MOI	1	DINF 2		
					TOTAL	5	EMPRESA 1		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:		Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº		04	
						DATA:		14/07/2021	

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.887/0001-03
Resp. Tec: Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 5...

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 9060411A
14/07/2021

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 095			
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	Julho		
31/03/2021	31/03/2022	365	95	270		SEMANA:	domingo		
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X					0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X					0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE							Sexta Feira		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	A contratada informa que não trabalhamos no dia 04/07/21 - Domingo								
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	0	0	0	0,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	0	0	0	0,00	Fiscal - Obra	0	0	0	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	0	0	0	0,00					0,00
EQUIPAMENTOS		QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS	TOTAL		CONTROLE - CQ		
				0,00	TOTAL EFETIVO		VIAS: 3		
					MOD	0	DINF: 2		
					MOI	0	EMPRESA: 1		
					TOTAL	0			
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:					Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				
					Setor: Planejamento		Reg. Fotográfico - Nº 04		
					DATA: 14/07/2021				

MV ENGENHARIA
CNPJ: 03.664.987/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 93058/BA

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 096			
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	05/07/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	96	269		SEMANA:	Julho		
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X					0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X					0,00	Sexta Feir		
NOITE						0,00	07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução instalação elétrica								
1.2	execução intalação hidrossanitária								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	2	0	2	18,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	5	0	5	45,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS		QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS	TOTAL EFETIVO		CONTROLE - CQ		
				0,00	MOD	5	VIAS: 3		
					MOI	1	DINF 2		
					TOTAL	6	EMPRESA 1		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 04 DATA: 14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-1
Resp. Tec. Michael A. Varg
Eng. Civil CREA/BA: 5.

ABIMAR FERREIRO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 93062-BA

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI				Contrato Nº	090/2021		
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.				RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 087		
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	06/07/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	97	268	SEMANA:	Julho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDICÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução instalação elétrica								
1.2	execução intalação hidrossanitária								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	2	0	2	18,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
									0,00
TOTAL	5	0	5	45,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1	0,00
				0,00	TOTAL EFETIVO				
					MOD	5			VIAS: 3
					MOI	1			DINF 2
					TOTAL	6			EMPRESA 1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 04 DATA: 14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. CIVIL CREA/BA: 93303

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 53604/BA
14/07/2021

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA				
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021				
LOCAL:		MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 088				
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	07/07/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	98	267	PERÍODO:	Julho				
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.								
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHA	X					0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X					0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						0,00	Sexta Feira			
							07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE					
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.									
1.1	Execução instalação elétrica									
1.2	execução intalação hidrossanitária									
1.3										
1.4										
1.5										
1.6										
1.7										
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA					
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas	
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00	
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00	
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00	
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00	
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00	
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00	
Encanador	2	0	2	18,00	Motorista	0	0	0	0,00	
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00	
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00	
	0	0	0	0,00					0,00	
TOTAL	5	0	5	45,00					0,00	
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL					
				0,00					0,00	
					TOTAL EFETIVO	1	0	1	0,00	
					MOD	5			VIAS: 3	
					MOI	1			DINF 2	
					TOTAL	6			EMPRESA 1	
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF					
ASS:					ASS:					
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX					
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº	04			
						DATA:	14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ/43.564.387/0001-68
Resp/ Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ABIMAEI SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604RA

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX									
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021				
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 098				
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	08/07/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	99	266	PERÍODO:	Julho			
ESCOPO				CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					
CONDICÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE					0,00	Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)			ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE					
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução instalação elétrica								
1.2	execução intalação hidrossanitária								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA				MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA					
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encarregado	2	0	2	18,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	5	0	5	45,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS	0,00	TOTAL EFETIVO	5	VIAS:	3	
					MOD	5	DINF	2	
					MOI	1	EMPRESA	1	
					TOTAL	6			
RESPONSÁVEL - OBRA:				FISCALIZAÇÃO - DINF					
ASS:				ASS:					
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA				RESPONSÁVEL - DINF/PMXX					
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.864.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90804784

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 100			
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	09/07/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	100	265		PERÍODO:	Julho		
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA		X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE		X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						0,00	Sexta Feira		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução instalação elétrica								
1.2	execução intalação hidrossanitária								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	2	0	2	18,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	5	0	5	45,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS		QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS	TOTAL EFETIVO		CONTROLE - CQ		
				0,00	MOD	5	VIAS:	3	
					MOI	1	DINF	2	
					TOTAL	6	EMPRESA	1	
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 83.564.387/0001-68
Resp. Téc. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ABIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 9040418

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 101			
INICIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	REstante	DATA:	10/07/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	101	264	PERÍODO:	Julho			
ESCOPO					SEMANA:	sábado			
CONDIÇÕES DO TEMPO					HORÁRIO:	07:00 as 17:00			
	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	A contratada informa que não trabalhamos no dia - 10/07/21 - sábado.								
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	0	0	0	0,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	0	0	0	0,00	Fiscal - Obra	0	0	0	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
									0,00
TOTAL	0	0	0	0,00	TOTAL	0	0	0	0,00
EQUIPAMENTOS		QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS	TOTAL EFETIVO		CONTROLE - CQ		
				0,00	MOD	0	VIAS:	3	
					MOI	0	DINF	2	
					TOTAL	0	EMPRESA	1	
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.684.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93030

ABIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 906049/A

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX									
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021				
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 102				
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	11/07/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	102	263	PERÍODO:	Julho			
ESCOPO				CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					
CONDICÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)			ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE					
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	A contratada informa que não trabalhamos no dia - 11/07/21 - domingo.								
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	0	0	0	0,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	0	0	0	0,00	Fiscal - Obra	0	0	0	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	0	0	0	0,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	0	0	0	0,00
			0,00		TOTAL EFETIVO				
					MOD	0			VIAS: 3
					MOI	0			DINF 2
					TOTAL	0			EMPRESA 1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 930. . .

AZIMEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90804/BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 103			
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	12/07/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	103	262	PERÍODO:	Julho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDICÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução e acabamento da pintura paredes internas e externas.								
1.2	Limpeza e acabamentos finais da obra								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	4	0	4	36,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	1	0	1	9,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
									0,00
									0,00
TOTAL	8	0	8	72,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO				CONTROLE - CQ
				0,00	MOD	8			VIAS:
					MOI	1			DINF
					TOTAL	9			EMPRESA
									1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-63
Rbsp. Jcc. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 936.2

ADIMAELO SOTERO BARROSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº	080/2021			
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 104			
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	13/07/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	104	261	PERÍODO:	Julho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDICÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução e acabamento da pintura paredes internas e externas.								
1.2	Limpeza e acabamentos finais da obra								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	4	0	4	36,00	Gerente - Obra	1	0	1	9,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	1	0	1	9,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	1	0	1	9,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
									0,00
									0,00
TOTAL	8	0	8	72,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	3	0	3	18,00
				0,00	TOTAL EFETIVO				
					MOD	8			VIAS:
					MOI	3			DINF
					TOTAL	11			EMPRESA
									3
									2
									1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		04		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:		14/07/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93000

ABIMAEI SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 905048A
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA			
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI				Contrato Nº	080/2021		
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.				RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 105		
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	14/07/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	105	260	PERÍODO:	Julho			
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					SEMANA:	quarta-feira	
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X					0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X					0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						0,00	Sexta Feira		
							07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE				
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução dos retoques e acabamentos finais da obra.								
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	4	0	4	36,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	1	0	1	9,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	8	0	8	72,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS		QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS	TOTAL EFETIVO		CONTROLE - CQ		
				0,00	MOD	8	VIAS: 3		
					MOI	1	DINF 2		
					TOTAL	9	EMPRESA 1		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 04 DATA: 14/07/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.584.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 930

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF	REL. Nº:	004/06
		DATA:	14/07/2021
		FOLHA	01/06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA RESP. TÍC: MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES I CONTRATO: 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA

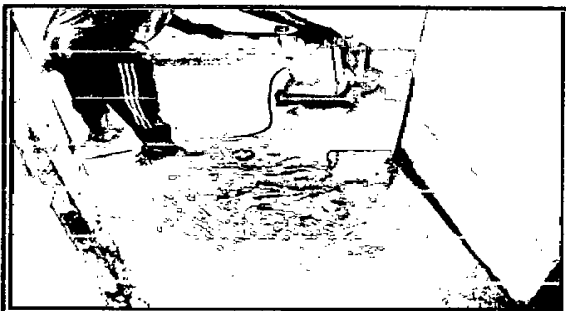


FOTO 01 - EXECUÇÃO DO POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE.



FOTO 02 - EXECUÇÃO DO POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE.

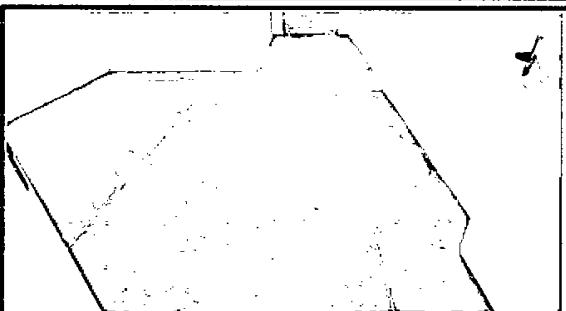


FOTO 03 - APLICAÇÃO RESINA NO PISO EM GRANILITE.

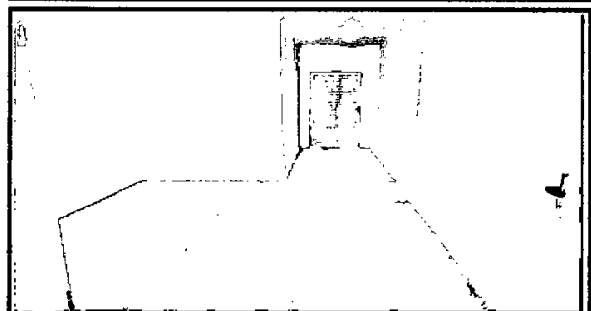


FOTO 04 - APLICAÇÃO RESINA NO PISO EM GRANILITE.




FOTO 05 - INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS EM MADEIRA.
(PORTAS)

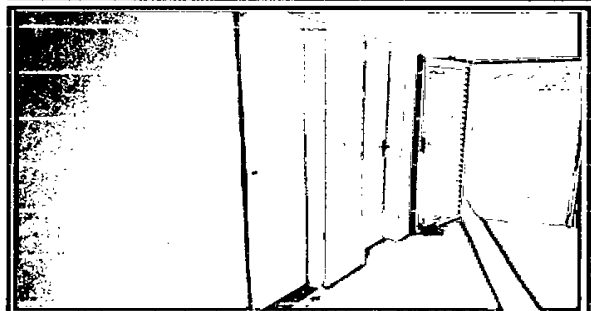



FOTO 06 - INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS EM MADEIRA.
(PORTAS)


MICHAEL A. VARGAS
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 905048A
MATRÍCULA: 7851

MV ENGENHARIA
CNPJ: 38.564.387/0001-68
Resp. Tíc. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF	REL. Nº:	004/06
		DATA:	14/07/2021
		FOLHA	02/06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA **CRESP. TÉCNICO:** MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES **CONTRATO:** 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA

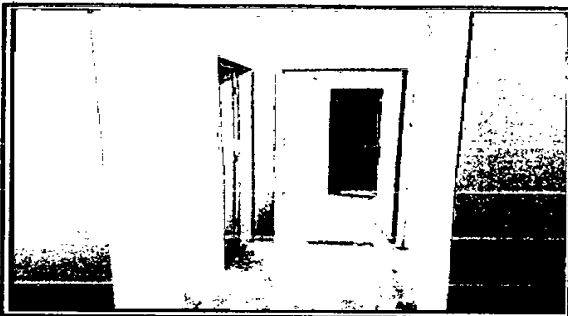


FOTO 07 - INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS EM MADEIRA.
(PORTAS)



FOTO 08 - INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS EM MADEIRA.
(PORTAS)

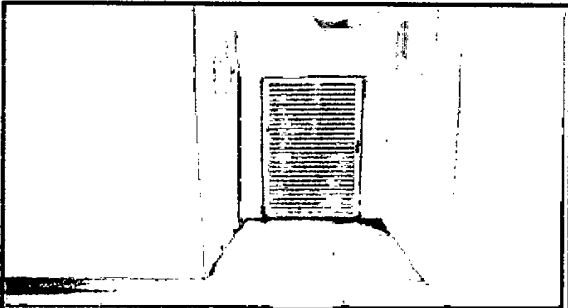


FOTO 09 - INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS EM METÁLICAS.
(PORTAS)

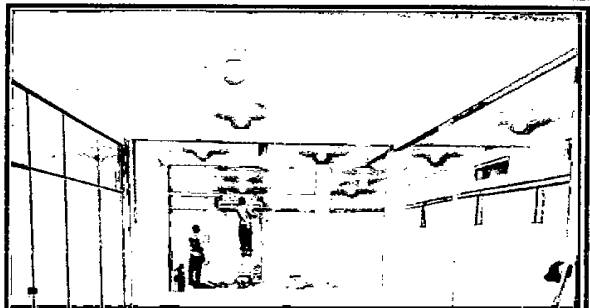


FOTO 10 - EXECUÇÃO DA PINTURA INTERNA. LIXAMENTO,
APLICAÇÃO MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DA PINTURA.




FOTO 11 - EXECUÇÃO DA PINTURA INTERNA. LIXAMENTO,
APLICAÇÃO MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DA PINTURA.



FOTO 12 - EXECUÇÃO DA PINTURA INTERNA. LIXAMENTO,
APLICAÇÃO MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DA PINTURA.


ACIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 9060411A
MATRÍCULA: 7851


MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.664.387/0001-63
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93003

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF	REL. Nº:	004/06
		DATA:	14/07/2021
		FOLHA	03/06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA **RESP. TÉC:** MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES **CONTRATO:** 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA

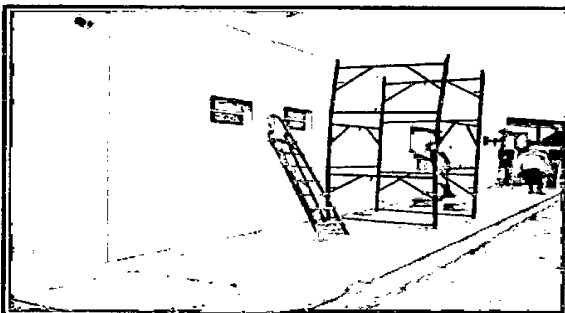


FOTO 13 - EXECUÇÃO DA PINTURA EXTERNA. LIXAMENTO, APLICAÇÃO MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DA PINTURA.

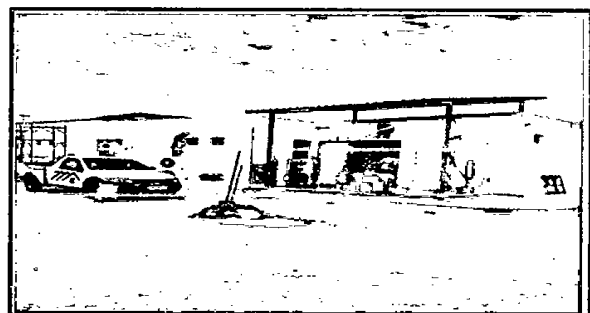


FOTO 14 - EXECUÇÃO DA PINTURA EXTERNA. LIXAMENTO, APLICAÇÃO MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DA PINTURA.




FOTO 15 - EXECUÇÃO DA PINTURA DO PISO INTERNO.

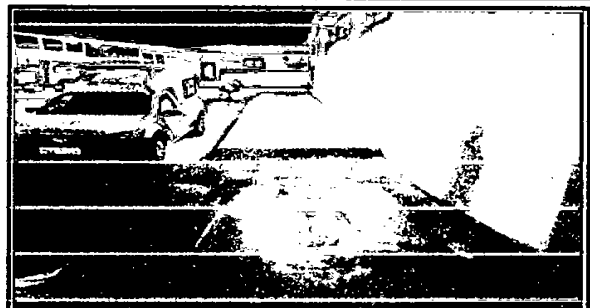


FOTO 16 - EXECUÇÃO DA PINTURA DO PISO EXTERNO (CALÇADA).

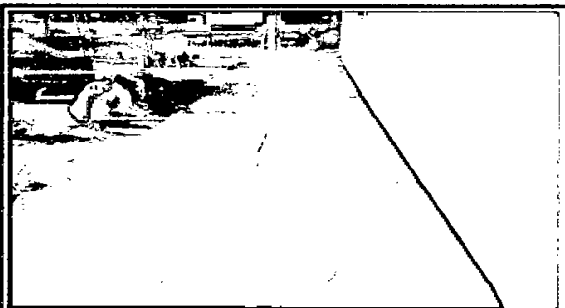


FOTO 17 - EXECUÇÃO DA PINTURA DO PISO EXTERNO (CALÇADA).

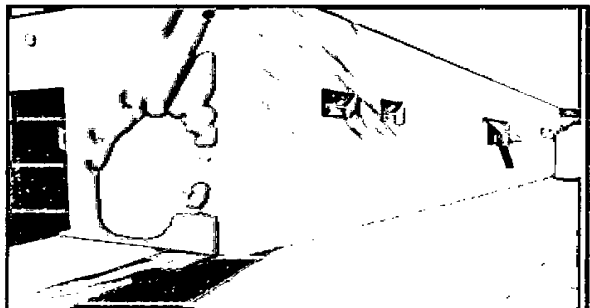


FOTO 18 - EXECUÇÃO DA PINTURA EXTERNA. LIXAMENTO, APLICAÇÃO MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DA PINTURA. EXECUÇÃO DA PINTURA DO PISO EXTERNO (CALÇADA).

ACIMAEL ESTER...
Cargo: Engenheiro Civil
CRL: 90.048A
MATRÍCULA: 7351

MV ENGENHARIA
CNPJ/33.561.882/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas.
Eng. Civil CREA/BA: 930.33

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF	REL. Nº:	004/06
		DATA:	14/07/2021
		FOLHA	04/06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA RESP. TÉC: MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES CONTRATO: 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA




FOTO 19 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO.




FOTO 20 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO.



FOTO 21 - INSTALAÇÃO DA PIA DA COPA.

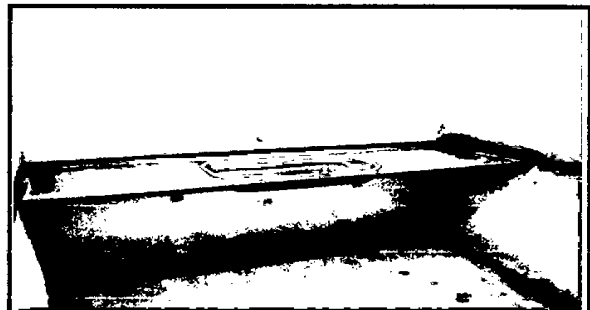


FOTO 22 - INSTALAÇÃO DA PIA DO EXPURGO.

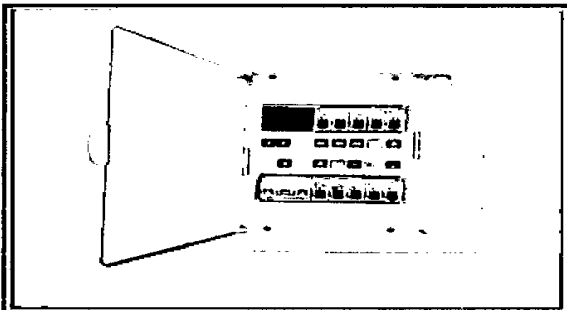


FOTO 23 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO. QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES.






FOTO 24 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO. INTERRUPTORES E TOMADAS


ACIMAELO SOUTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 98504114
MATRÍCULA: 7851


M.V. ENGENHARIA
CNPJ: 09/68.387.000/00-3
Resp. Tc. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 95603

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF	REL. Nº:	004/06
		DATA:	14/07/2021
		FOLHA	05/06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA **RESP. TÉC:** MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES **CONTRATO:** 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA




FOTO 25 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO. INTERRUPTORES E TOMADAS




FOTO 26 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO. PLAFON E LAMPADAS



FOTO 26 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO. PLAFON E LAMPADAS



FOTO 27 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO. ARRADELAS EXTERNAS.

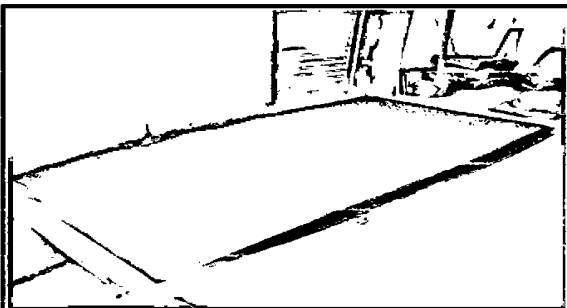


FOTO 27 - EXECUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO À CENTRAL DE GÁS




FOTO 28 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO FORRO DE GESSO

Michael A. Vargas
MICHAEL SOLEDO DE ROSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 50264BA
MATRÍCULA: 7851

MV ENGENHARIA
CNPJ: 30.867.903/0001-68
Resp. Téc. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF	REL. Nº:	004/06
		DATA:	14/07/2021
		FOLHA	06/06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA E RESP. TÉC: MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES E CONTRATO: 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA




FOTO 29 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO FORRO DE GESSO.

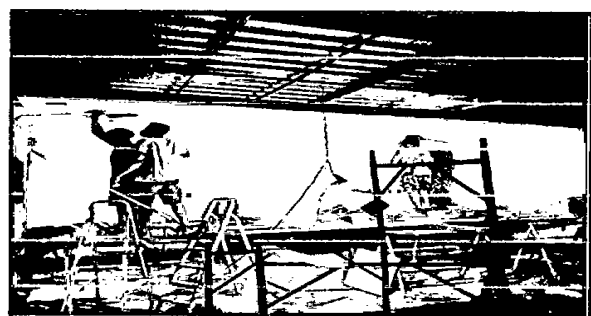


FOTO 30 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO FORRO DE GESSO.

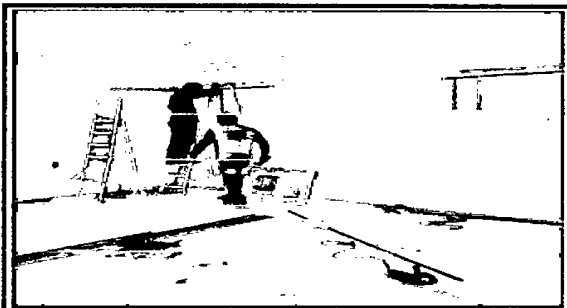


FOTO 31 - INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS.

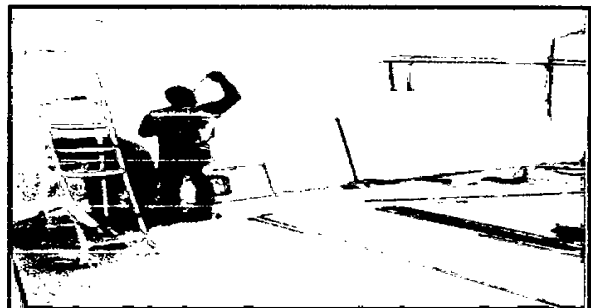


FOTO 32 - INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS.

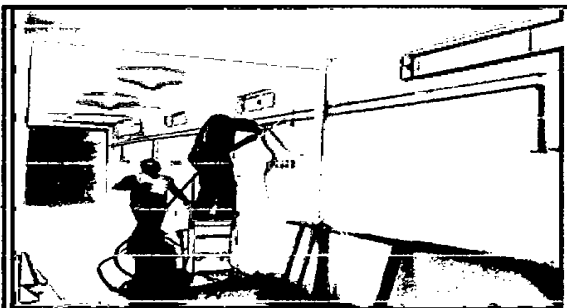


FOTO 33 - INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS.

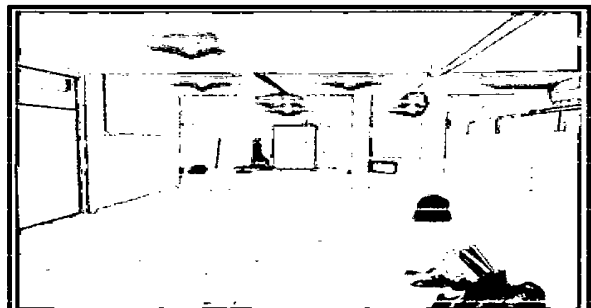


FOTO 34 - INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS.


MICHAEL A. VARGAS
Cargo: Engenharia Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.367/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93021



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 23/09/2021 15:07

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.966 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20213915682

RAZÃO SOCIAL	
MVENGENHARIA E CONTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.564.387/0001-68

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/09/2021, conforme Portaria nº 916/89, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Certidão nº: 29075320/2021
Expedição: 23/09/2021, às 14:42:28
Validade: 21/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.564.387/0001-68, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cnj.tst.jus.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 33.564.387/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:52:36 do dia 17/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2022.
Código de controle da certidão: **9DEB.DDD5.9249.0C5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

04/11/2021 16:20

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.564.387/0001-68

Razão Social: M V ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA SILVA JARDIN 12 / CASA / XIQUE-XIQUE / BA / 47400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/10/2021 a 18/11/2021

Certificação Número: 2021102000582567917028

Informação obtida em 04/11/2021 16:20:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUE

CNPJ nº 13.880.257/0001-27, PCA. DOM MÁXIMO, 384 - TÉRREO - CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

**Certidão Negativa de Débitos para com a
Fazenda Municipal
Nº 4906/2021**


Razão Social: **M.V ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**
Nome Fantasia: **MV ENGENHARIA**
CNPJ: **33.564.383/0001-68**
Inscrição: **5.4.001631**
Endereço: **RUA SILVA JARDIM, 12 - ANDAR 1 - CENTRO, XIQUE-XIQUE -
BA**

Reservado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente, é certificado que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS** em nome da EMPRESA acima citada para este município.

Esta Certidão foi emitida em 15/09/2021 com base no Código Tributário Nacional lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 14/12/2021.

48396103000009000654001631





Anotação da Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210501830

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABIMAELO SOTERO BARBOZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0513170570

Registro: 00604BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**

CPF/CNPJ: 13.680.257/0001-27

PRAÇA DOM MÁXIMO

Nº: 384

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Xique-Xique**

UF: **BA**

CEP: 47400600

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Erotides Nogueira

Nº: 703

Complemento: **Hospital Julieta Viana**

Bairro: **Centro**

Cidade: **XIQUE-XIQUE**

UF: **BA**

CEP: 47400600

Data de início: **01/04/2021**

Previsão de término: **31/03/2022**

Coordenadas Geográficas: **-10.852078, -42.732087**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**

CPF/CNPJ: 13.680.257/0001-27

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
13 - Fiscalização		
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	11,50	m³
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	264,96	m²
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	61,00	pontos
121 - Fiscalização de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST. ELÉTR. EM BAIXA TENSÃO P/RESID./COMERC.	201,00	pontos
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	479,00	m²
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS	23,85	m²
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6,30	m³
316 - Demolição > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	21,20	m³
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL	479,00	m²
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #910 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS CANALIZADO EM EDIFICAÇÕES	1,00	un
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	23,95	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Construção e reforma para instalação de 20 Unidades de Tratamento Intensivo e Semi Intensivo. Ref. CT080/2021.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://arsa-ba.siba.com.br/publico/> com a chave: YbAFZ
Impresso em: 08/05/2021 às 16:23:35 por: ip: 178.182.13.1

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3455-8590

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-6982

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Página 2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210501830

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

8. Assinaturas

Dedaro serem verdadeiras as informações acima


GABRIEL BOTERO BARBOSA - CPF: 004.776.035-48

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE - CNPJ: 18.880.287/0001-27

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crag.

10. Valor

Valor de ART: R\$ 88,78 Registrada em: 16/04/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nota Número: 62812575

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sites.com.br/publico/>, com a chave: YBA7Z
Impresso em: 05/09/2021 às 15:23:35 por: ip: 179.198-13.1

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8900

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8969

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210498455

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico
MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0513625530
Registro: 830588A
Empresa contratada: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Registro: 0010147225-BA

2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura Municipal de Xique-Xique
Praça Dom Máximo
Complemento:
Cidade: XIQUE-XIQUE
Bairro: Centro
UF: BA
CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27
Nº: 384
CEP: 47400000
Contrato: 088/2021
Valor: R\$ 316.748,00
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Celebrado em: 31/03/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
RUA R. Ercildes Nogueira
Complemento: Hospital Julieta Viana
Cidade: XIQUE-XIQUE
Data de início: 01/04/2021
Previsão de término: 31/03/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura Municipal de Xique-Xique
Nº: 703
Bairro: Centro
UF: BA
CEP: 47400000
Coordenadas Geográficas: -10.832078, -42.732087
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - Execução		
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	479,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	264,86	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	11,50	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	152,06	m2
111 - Execução de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	201,00	pontos
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	61,00	pontos
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS	23,95	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	23,95	m2
316 - Demolição > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	21,20	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #810 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS CANALIZADO EM EDIFICAÇÕES	1,00	pontos
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6,30	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL	479,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
CONST. E REFORMA PROVISÓRIA DE 20UNDª DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO AO COMBATE DO COVID-19.

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3x1Wb
Impresso em: 12/04/2021 às 14:10:40 por: ip: 177.83.221.34

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8980

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8980

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210498455

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Xique-Xique em 14 de Junho de 2021
Local data

Michael Assunção Vargas
MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS - CPF: 031.258.063-33

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - CNPJ: 13.880.257/0001-27

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 | Registrado em: 09/04/2021 | Valor pago: R\$ 233,94 | Nosso Número: 52841582

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.altac.com.br/publico/>, com a chave: 3x1Wb
Impresso em: 12/04/2021 às 14:10:40 por: ip: 177.93.221.34

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...>



Emissão de comprovantes

G3360508362268441
05/11/2021 08:41:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.23
1171101171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 18.686-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2328-0 - IRECE - BA
CONTA: 13.000.805-0

FAVORECIDO: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRE
CPF/CNPJ: 33.564.387/0001-68
VALOR: R\$ 15.948,08
DEBITO EM: 05/11/2021

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: C.059.793.606.C09.894

Transação efetuada com sucesso por: JB536812 MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

NOVEMBRO/2021

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
RG: Insc. Estadual:
Endereço: RUA SILVA JARDIM Cidade: Xique-Xique UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 028 - 4ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENVISIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$	9.646,01	Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	0,00	001	11711	186864	001	9.646,01
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	9.646,01	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 9.646,01 (NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

5 de Novembro de 2021

Recebedor

PRESTAÇÃO DE CONTAS (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 504/2021)



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

NOVEMBRO/2021

Processo Pagamento: **504** Fonte: 0129000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Data: 03/11/2021

FORNECEDOR

Nome: DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI CNPJ/CPF: 25398752000183
Endereço: R PROJETADA Compl: ANEXO
Bairro: CENTRO Cidade: Capela UF: SE
E-mail: dj.licitacao@gmail.com Telefone: (79)98031-320 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0004 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
Ação: 2052 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro Custo: 11 MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº PE005/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
101	15/06/2021	17.550,00	17.550,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021 - CONTRATO Nº 122/2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.367 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021 - CONTRATO Nº 122/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 20/09/2021	17.550,00

Retenção	Valor
----------	-------

DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	17.550,00

Data: 03/11/2021 Conta: 255637 - XIQUE - XIQUE COVID EPI Autorização de Débito: 001

MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mat.303

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SETEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 0129000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Data: 20/09/2021

FORNECEDOR

Nome: DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI CNPJ/CPF: 25398752000183
Endereço: R PROJETADA Compl: ANEXO
Bairro: CENTRO Cidade: Capela UF: SE
E-mail: dj.llicitacao@gmail.com Telefone: (79)98031-320 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0004 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
Ação: 2052 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo – Outros
Fonte: 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro Custo: 11 MATERIAIS DE CONSUMO

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
101	15/06/2021	17.550,00	17.550,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021 - CONTRATO Nº 122/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.367 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021 - CONTRATO Nº 122/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal (367 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 05/08/2021)	17.550,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	17.550,00

DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	17.550,00

Emitido em 15/06/2021

Data: 20/09/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE
AV PRACA 6 DE JULHO, 146 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 13.582.852/0001-86

Nota de Empenho
JUNHO/2021

Nota de Empenho 101 Tipo: Global Data: 15/06/2021

FORNECEDOR

Nome: DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI
CNPJ/CPF: 25398752000183
Endereço: R PROJETADA, 78
Bairro: CENTRO
E-mail: dj.licitacao@gmail.com
PIS/PASEP:
Compl: ANEXO
Cidade: Capela
UF: SE
Telefone: (79)98031-320
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0004 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
Ação: 2052 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro Custo: 11 MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº PE005/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
122 / 2021		Global	209.000,00	1.000,00	208.000,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021 - CONTRATO Nº 122/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19343 - MATERIAL DE CONSUMO	UND	1.000	1.000,0000	1.000,0000

UM MIL REAIS

1.000,00

Emitido em 15/06/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mat.303

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE
Reforço de Empenho

SETEMBRO/2021

Processo Reforço 50 Fonte: 0129000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FENAS

FORNECEDOR

Nome: DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI CNPJ/CPF: 25398752000183
Endereço: R PROJETADA Compl: ANEXO
Bairro: CENTRO Cidade: Capela UF: SE

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0004 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
Ação: 2052 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

Licitação: 38 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO ALTERADO				SALDO ANTERIOR	VALOR REFORÇO	SALDO DISPONÍVEL
Nº	TIPO	EMIÇÃO	CONTRATO	1.000,00	16.550,00	17.550,00
101	Global	15/06/2021	122/2021			

HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO.

DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

16.550,00

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,00	1.000,00	1.000,00

UM MIL REAIS

1.000,00



Data: 20/09/2021

Autorizo a ALTERAÇÃO do empenho

Este Reforço foi processada de acordo com a legislação vigente

MARLON BRANDO SOUZA LOIOLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mat.8627

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

 <p>DJ COMÉRCIO EM GERAL</p> <p>DJ COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI RUA PROJETADA, 078 CENTRO - 49700000 Capela/SE 7932440757</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 367 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2821 0825 3987 5200 0183 5500 1000 0003 6715 4627 5670</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																													
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210010158850 05/08/2021 17:18:42</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 271540184</p>		<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ/CPF 25398752000183</p>																																																									
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>				<p>NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</p>		<p>CNPJ/CPF 13582852000186</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 05/08/2021</p>																																																									
<p>ENDEREÇO AV PRACA 6 DE JULHO 146</p>		<p>BAIRRO centro</p>		<p>CEP 47400000</p>		<p>DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/08/2021</p>		<p>MUNICÍPIO Xique-Xique</p>																																																									
<p>FONE/FAX 7436613527</p>		<p>UF BA</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 17:14:00</p>		<p>FATURA / DUPLICATAS</p>																																																									
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>																																																																	
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.550,00</p>																																																									
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>		<p>DESCONTO 0,00</p>		<p>OUTRAS DESPESAS 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>																																																									
<p>VALOR TOTAL DA NOTA 17.550,00</p>								<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>																																																									
<p>RAZÃO SOCIAL VIPCARGAS TRANSPORTES LTDA-EPP</p>				<p>FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE</p>		<p>CODIGO ANTT</p>		<p>PLACA DO VEICULO</p>																																																									
<p>ENDEREÇO R. Leonel Curvelo, 1139 - - Suissa - CEP: 49.050-485</p>				<p>MUNICÍPIO Aracaju</p>		<p>UF SE</p>		<p>CNPJ/CPF 19306559000172</p>																																																									
<p>QUANTIDADE 4</p>		<p>ESPÉCIE SACOS</p>		<p>MARCA</p>		<p>NUMERAÇÃO</p>		<p>PESO BRUTO 0,000</p>																																																									
<p>PESO LÍQUIDO 0,000</p>								<p>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</p>																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CÁLC</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>553</td> <td>MASCARAS LAVAVEL ANATOMICA NA COR AZUL, DE ALGOOL 100% ALGODAO ANTIALERGICO, CAMADA DUPLA, TAMANHO CRIANCAS DE 06 ANOS D</td> <td>39269090</td> <td>0102</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>5000,0000</td> <td>1,17000</td> <td>5.850,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>554</td> <td>MASCARAS LAVAVEL ANATOMICA NA COR AZUL, DE ALGOOL 100% ALGODAO ANTIALERGICO, CAMADA DUPLA, TAMANHO CRIANCAS DE 12 ANOS D</td> <td>39269090</td> <td>0102</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>5000,0000</td> <td>1,17000</td> <td>5.850,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>555</td> <td>MASCARAS LAVAVEL ANATOMICA NA COR AZUL, DE ALGOOL 100% ALGODAO ANTIALERGICO, CAMADA DUPLA, TAMANHO UNICO PARA ADULTOS.</td> <td>39269090</td> <td>0102</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>5000,0000</td> <td>1,17000</td> <td>5.850,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	553	MASCARAS LAVAVEL ANATOMICA NA COR AZUL, DE ALGOOL 100% ALGODAO ANTIALERGICO, CAMADA DUPLA, TAMANHO CRIANCAS DE 06 ANOS D	39269090	0102	6102	UND	5000,0000	1,17000	5.850,00						554	MASCARAS LAVAVEL ANATOMICA NA COR AZUL, DE ALGOOL 100% ALGODAO ANTIALERGICO, CAMADA DUPLA, TAMANHO CRIANCAS DE 12 ANOS D	39269090	0102	6102	UND	5000,0000	1,17000	5.850,00						555	MASCARAS LAVAVEL ANATOMICA NA COR AZUL, DE ALGOOL 100% ALGODAO ANTIALERGICO, CAMADA DUPLA, TAMANHO UNICO PARA ADULTOS.	39269090	0102	6102	UND	5000,0000	1,17000	5.850,00					
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																																																				
553	MASCARAS LAVAVEL ANATOMICA NA COR AZUL, DE ALGOOL 100% ALGODAO ANTIALERGICO, CAMADA DUPLA, TAMANHO CRIANCAS DE 06 ANOS D	39269090	0102	6102	UND	5000,0000	1,17000	5.850,00																																																									
554	MASCARAS LAVAVEL ANATOMICA NA COR AZUL, DE ALGOOL 100% ALGODAO ANTIALERGICO, CAMADA DUPLA, TAMANHO CRIANCAS DE 12 ANOS D	39269090	0102	6102	UND	5000,0000	1,17000	5.850,00																																																									
555	MASCARAS LAVAVEL ANATOMICA NA COR AZUL, DE ALGOOL 100% ALGODAO ANTIALERGICO, CAMADA DUPLA, TAMANHO UNICO PARA ADULTOS.	39269090	0102	6102	UND	5000,0000	1,17000	5.850,00																																																									
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>																																																																	
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2942</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>			<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>			<p>VALOR DO ISSQN</p>																																																									
<p>DADOS ADICIONAIS</p>								<p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																									
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT". REFERENTE AO EMPENHO: ASS005863/2021, BANCO DO BRASIL (001), AG: 0280-1 C/C:23306-4 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.360,46 de tributos federais R\$ 3.159,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76</p>								<p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																									

28/05/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI
CNPJ: 25.398.752/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:35:06 do dia 28/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2021.

Código de controle da certidão: **1DA2.A718.542A.444B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

04/10/2021 17:49

: SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 1090451/2021

Inscrição Estadual: 27.154.018-4
Razão Social: DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI
CNPJ: 25.398.752/0001-83
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Endereço: RUA PROJETADA ANEXO 78
CENTRO - CAPELA CEP: 49700000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **04/10/2021 17:48:58**, válida até **03/11/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 4 de Outubro de 2021

Autenticação:202110040SWL9X

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.398.752/0001-83
Certidão nº: 15813930/2021
Expedição: 17/05/2021, às 10:56:45
Validade: 12/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.398.752/0001-83, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cnct@tst.jus.br

Consulta Regularidade do Empregador

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmprega...>



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 25.398.752/0001-83
Razão Social: DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI
Endereço: RUA PROJETADA 78 / CENTRO / CAPELA / SE / 49700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/11/2021 a 01/12/2021

Certificação Número: 2021110202323405097226

Informação obtida em 03/11/2021 11:10:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO


Endereço: RUA COELHO E CAMPOS, 1201-CENTRO Telefone: (79)3263-2021 CNPJ: 13.119.961/0001-61

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 08/09/2021

Contribuinte: DJ COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI		Inscrição Mercantil: 2942 Sequencial:
Localização: RUA PROJETADA, 78, , CENTRO		Referência Loteamento:
Natureza: Tributos Mercantis		Cadastro Imobiliário:
Razão Social: DJ COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI		Inscrição Imobiliária:
CNPJ/CPF 25.398.752/0001-83	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil 2942
Código Atividade Principal: 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Código Atividade Sec.: 4520004 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	
Início Atividade: 06/08/2016	Validade: 07/11/2021	
Observações: Válido por 59 dias.		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.



Para validar a autenticidade desta certidão acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/gestor/prefeitura/capelase/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

486B46C75E509ABB0185569206BA95C77BD5541C

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...>



Emissão de comprovantes

G3320311291099731
03/11/2021 11:33:00

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:34
117101171 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: XIQUE-XIQUECOVIDEPI
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 25.563-7

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.280.000.023.306
VALOR TOTAL 17.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DJ COM E SERVICO EM GERAL
AGENCIA: 0280-1 CONTA: 23.306-4
NR. DOCUMENTO 551.171.000.025.563

NR. AUTENTICACAO B.EEF.CBE.26B.248.E85

Transação efetuada com sucesso por: JE715945 MIRIAM DE OLIVEIRA.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

NOVEMBRO/2021

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: DJ COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI CNPJ/CPF: 25398752000183
RG: Insc. Estadual:
Endereço: R PROJETADA Cidade: Capela UF:SE
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.367 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021 - CONTRATO Nº 122/2021.

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$		Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	0,00	.001	117,11	255637	001	17.550,00
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	17.550,00	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) SE a quantia supra de R\$ 17.550,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE, SE

3 de Novembro de 2021

Recebedor
