



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Segunda-feira • 23 de agosto de 2021 • Ano V • Edição Nº 965



QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2
ATOS OFICIAIS	2
BOLETIM INFORMATIVO (Nº 422/2021)	2
BOLETIM INFORMATIVO (Nº 423/2021)	3
BOLETIM INFORMATIVO (Nº 424/2021)	4
BOLETIM INFORMATIVO (Nº 425/2021)	5
BOLETIM INFORMATIVO (Nº 426/2021)	6
CONTAS PÚBLICAS	7
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1168/2021)	7
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	77
CONTAS PÚBLICAS	77
PRESTAÇÃO DE CONTAS (DEMONSTRATIVO DE RECEITAS 8 - AGOSTO/2021)	77

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO

<http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

BOLETIM INFORMATIVO (Nº 422/2021)

boletim coronavírus

XIQUE-XIQUE - BAHIA



16 de agosto de 2021



18h00



Nº 422

VACINADOS 1ª DOSE

24363

VACINADOS 2ª DOSE

9687

VACINADOS DOSE ÚNICA

522

CASOS
ATIVOS

27

ÓBITOS

76

SUSPEITOS

44

MONITO-
RAMENTO

71

INTERNADOS

05

EM USO DE OXIGÊNIO

02

REGULAÇÃO REALIZADA

02

ENTUBADO

02

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Ligação: (74) 3661-2041

Whatsapp: (74) 9 9947-6227



PREFEITURA
XIQUE-XIQUE
TRABALHO SÉRIO, FUTURO CERTO.

BOLETIM INFORMATIVO (Nº 423/2021)

boletim coronavírus

XIQUE-XIQUE - BAHIA



17 de agosto de 2021



18h00



Nº 423

VACINADOS 1ª DOSE

24489

VACINADOS 2ª DOSE

9687

VACINADOS DOSE ÚNICA

522

**CASOS
ATIVOS**

27

ÓBITOS

76

SUSPEITOS

44

**MONITO-
RAMENTO**

71

INTERNADOS

01

EM USO DE OXIGÊNIO

0

REGULAÇÃO REALIZADA

0

INTUBADO

0

CENTRAL DE ATENDIMENTO

☎ Ligação: (74) 3661-2041

💬 Whatsapp: (74) 9 9947-6227



**PREFEITURA
XIQUE-XIQUE**

TRABALHO SÉRIO, FUTURO CERTO.

BOLETIM INFORMATIVO (Nº 424/2021)

boletim coronavírus

XIQUE-XIQUE - BAHIA



18 de agosto de 2021



18h00



Nº 424

VACINADOS 1ª DOSE

24489

VACINADOS 2ª DOSE

9687

VACINADOS DOSE ÚNICA

522

**CASOS
ATIVOS**

25

ÓBITOS

77

SUSPEITOS

44

**MONITO-
RAMENTO**

69

INTERNADOS

0

EM USO DE OXIGÊNIO

0

REGULAÇÃO REALIZADA

0

INTUBADO

0

CENTRAL DE ATENDIMENTO

☎ Ligação: (74) 3661-2041

💬 Whatsapp: (74) 9 9947-6227



**PREFEITURA
XIQUE-XIQUE**

TRABALHO SÉRIO, FUTURO CERTO.

BOLETIM INFORMATIVO (Nº 425/2021)

boletim coronavírus

XIQUE-XIQUE - BAHIA



19 de agosto de 2021



18h00



Nº 425

VACINADOS 1ª DOSE

24489

VACINADOS 2ª DOSE

9752

VACINADOS DOSE ÚNICA

522

**CASOS
ATIVOS**

20

ÓBITOS

77

SUSPEITOS

30

**MONITO-
RAMENTO**

50

INTERNADOS

0

EM USO DE OXIGÊNIO

0

REGULAÇÃO REALIZADA

0

INTUBADO

0

CENTRAL DE ATENDIMENTO

☎ Ligação: (74) 3661-2041

💬 Whatsapp: (74) 9 9947-6227



**PREFEITURA
XIQUE-XIQUE**

TRABALHO SÉRIO, FUTURO CERTO.

BOLETIM INFORMATIVO (Nº 426/2021)

boletim coronavírus

XIQUE-XIQUE - BAHIA



20 de agosto de 2021



18h00



Nº 426

VACINADOS 1ª DOSE

25480

VACINADOS 2ª DOSE

9752

VACINADOS DOSE ÚNICA

522

**CASOS
ATIVOS**

14

ÓBITOS

77

SUSPEITOS

30

**MONITO-
RAMENTO**

44

INTERNADOS

0

EM USO DE OXIGÊNIO

0

REGULAÇÃO REALIZADA

0

INTUBADO

0

CENTRAL DE ATENDIMENTO

☎ Ligação: (74) 3661-2041

💬 Whatsapp: (74) 9 9947-6227



**PREFEITURA
XIQUE-XIQUE**

TRABALHO SÉRIO, FUTURO CERTO.

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1168/2021)



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE

Processo de Pagamento Orçamentário

AGOSTO/2021

Processo Pagamento: **1168** Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% Data: 19/08/2021 00:00:00

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM Compl: ANDAR 1
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: varcon@varcon.com.br Telefone: (74)3661-1596 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO ÂMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905101 Obras e Instalações (mão de obra)
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 33 OBRAS E INSTALAÇÕES

Licitação: Nº CC003/2021 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
266	31/03/2021	25.998,16	25.265,52	732,64

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF. NOTA FISCAL Nº 023 - 3ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
3 - 11/08/2021	25.265,52

Retenção	Valor
2188101080001-ISS a Recolher	505,31

VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido:	505,31
Total Líquido:	24.760,21

Data: 19/08/2021 Conta: 186864 - FMS - Recursos Próprios/Saúde 15%

Autorização de 001 Débito:

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

AGOSTO/2021

Processo Pagamento: **1169** Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% Data: 19/08/2021 00:00:00

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM Compl: ANDAR 1
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: varcon@varcon.com.br Telefone: (74)3661-1596 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO ÂMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905102 Obras e Instalações (material)
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custó: 33 OBRAS E INSTALAÇÕES

Licitação: Nº CC003/2021 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
371	31/03/2021	38.497,24	37.898,27	598,97

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF. NOTA FISCAL Nº 023 - 3ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
3 - 11/08/2021	37.898,27

Retenção	Valor
----------	-------

TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	37.898,27

Data: 19/08/2021 Conta: 186864 - FMS - Recursos Próprios/Saúde 15% Autorização de 001 Débito:

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

AGOSTO/2021

Nota de Liquidação: 3 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% Data: 11/08/2021

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM Compl: ANDAR 1
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: varcon@varcon.com.br Telefone: (74)3661-1596 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905101 Obras e Instalações (mão de obra)
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 33 OBRAS E INSTALAÇÕES

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
266	31/03/2021	25.998,16	25.265,52	732,64

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 023 - 3ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal (023 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 10/08/2021)	25.265,52

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
12321050100 - OBRAS EM ANDAMENTO	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	25.265,52

Retenção	Valor
2188101080001-ISS a Recolher	505,31

VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido:	505,31
Total Liquido:	24.760,21



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

AGOSTO/2021

Nota de Liquidação: 3	Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Data: 11/08/2021
-----------------------	--	------------------

Data: 11/08/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

AGOSTO/2021

Nota de Liquidação: 3 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% Data: 11/08/2021

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM Compl: ANDAR 1
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: varcon@varcon.com.br Telefone: (74)3661-1596 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905102 Obras e Instalações (material)
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 33 OBRAS E INSTALAÇÕES

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
371	31/03/2021	38.497,24	37.898,27	598,97

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 023 - 3ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal (023 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 10/08/2021)	37.898,27

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	37.898,27

TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	37.898,27

Data: 11/08/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE

PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 371

Tipo: Global Data: 31/03/2021

FORNECEDOR

Nome:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		
CNPJ/CPF:	33564387000168		
Endereço:	RUA SILVA JARDIM, 12	Compl:	ANDAR 1
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique UF: BA
E-mail:	varcon@varcon.com.br	Telefone:	(74)3661-1596
PIS/PASEP:		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:		Agência:	Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0003 SAÚDE
Ação:	4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa:	44905100 Obras e Instalações
SubElemento:	44905102 Obras e Instalações (material)
Fonte:	6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo:	33 OBRAS E INSTALAÇÕES

Licitação: Nº CC003/2021 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
080 / 2021		Global	120.000,00	120.000,00	0,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE, CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19344 - OBRAS E INSTALAÇÕES	UND	1,0000	120.000,0000	120.000,0000

CENTO E VINTE MIL REAIS 120.000,00

Emitido em 31/03/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 266 Tipo: Global Data: 31/03/2021

FORNECEDOR			
Nome:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		
CNPJ/CPF:	33564387000168		
Endereço:	RUA SILVA JARDIM, 12	Compl:	ANDAR 1
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique UF: BA
E-mail:	varcon@varcon.com.br	Telefone:	(74)3661-1596
PIS/PASEP:		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:		Agência:	Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0003 SAÚDE
Ação:	4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa:	44905100 Obras e Instalações
SubElemento:	44905101 Obras e Instalações (mão de Obra)
Fonte:	6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo:	33 OBRAS E INSTALAÇÕES

Licitação: Nº CC003/2021 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
080 / 2021		Global	200.000,00	80.000,00	120.000,00

HISTÓRICO
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE.. CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19413 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	UND	1,0000	80.000,0000	80.000,0000

OITENTA MIL REAIS

80.000,00

Emitido em 31/03/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Reforço de Empenho

AGOSTO/2021

Processo Reforço 119 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM Compl: ANDAR 1
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO ÂMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações

Licitação: 35 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

EMPENHO ALTERADO			SALDO ANTERIOR	VALOR REFORÇO	SALDO DISPONÍVEL
Nº	TIPO	EMIÇÃO	80.000,00	25.000,00	105.000,00
266	Global	31/03/2021			

HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO.

VINTE E CINCO MIL REAIS

25.000,00

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	UND	1,00	80.000,00	80.000,00

OITENTA MIL REAIS

80.000,00

Data: 11/08/2021

Autorizo a ALTERAÇÃO do empenho

Este Reforço foi processada de acordo com a legislação vigente

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Reforço de Empenho

AGOSTO/2021

Processo Reforço 120

Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 33564387000168
Endereço: RUA SILVA JARDIM Compl: ANDAR 1
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 4001 APOIO A ENTIDADE HOSPITAL JULIETA VIANA NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PELA PANDEMIA DA COVID-19
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações

Licitação: 35 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

EMPENHO ALTERADO			SALDO ANTERIOR	VALOR REFORÇO	SALDO DISPONÍVEL
Nº	TIPO	EMIÇÃO	120.000,00	36.000,00	156.000,00
371	Global	31/03/2021			

HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO.

TRINTA E SEIS MIL REAIS					36.000,00
Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	OBRAS E INSTALAÇÕES	UND	1,00	120.000,00	120.000,00
CENTO E VINTE MIL REAIS					120.000,00

Data: 11/08/2021

Autorizo a ALTERAÇÃO do empenho

Este Reforço foi processada de acordo com a legislação vigente

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629

	PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE CNPJ nº 13.880.257/0001-27, Praça Don Máximo, 384, Sede, CENTRO, CEP 47.400-000	Número: 23 10/08/2021
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Cód. Verificação
	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica - Série A1	 5DVZ50726

PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
Razão Social: M.V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI		
CNPJ: 33.564.387/0001-68	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal: 5.4.001681
Endereço: RUA SILVA JARDIM, 12, ANDAR 1, CENTRO, CEP 47.400-000		
Município: Xique-Xique UF: Bahia		

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS	
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE	
CNPJ: 13.880.257/0001-27	Inscrição Estadual:
Endereço: Praça Don Máximo, 384, Sede, CENTRO, CEP 47.400-000	
Município: Xique-Xique UF: Bahia	

Código do Serviço (Lei Complementar nº 116/2003)
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 080/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA., CONFORME CARTA-CONVITE 003/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 101/2021. FIMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE E A EMPRESA M.V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI. MATERIAL (60%): R\$ 37.898,27- MÃO DE OBRA (40%): R\$ 25.265,52. VALOR TOTAL: R\$ 63.163,79.
DADOS BANCÁRIOS: EMPRESA: M V ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
BANCO SANTANDER AG: 2328 CONTA: 00013000805-0 CNPJ: 33.564.387/001-68

ITENS DA NOTA FISCAL				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
Material utilizado na Obra	un	1	37.898,27	37.898,27
Serviços de obras de Construção Civil	un	1	25.265,52	25.265,52

	VALOR TOTAL DA NOTA: 63.163,79				
	PIS: 0,00	CORINS: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	CSLL: 0,00
	Base de Cálculos: 25.265,52				
	Optante Simples: Sim	Alíquota ISS: 2,00%	Valor ISS: 505,31	Valor Líquido: 62.658,48	
A autenticidade desta Nota Fiscal está sujeita a verificação. Para isso, acesse o site www.xiquexique.ba.gov.br e informe o código de verificação da nota fiscal.					

BCD Sistemas (74) 3841-4465



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 02/08/2021 15:43

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº. 20213091491

RAZÃO SOCIAL	
MVGENGENHARIA E CONTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.564.387/0001-68

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/08/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Certidão nº: 15980954/2021
Expedição: 18/05/2021, às 17:24:48
Validade: 13/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.564.387/0001-68, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 33.564.387/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:31:25 do dia 28/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2022.
Código de controle da certidão: **F12E.978A.63D5.74E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta Regularidade do Empregador

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmprega...>

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.564.387/0001-68
Razão Social: M V ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI
Endereço: RUA SILVA JARDIN 12 / CASA / XIQUE-XIQUE / BA / 47400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2021 a 03/09/2021

Certificação Número: 2021080501331581556034

Informação obtida em 19/08/2021 09:36:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUE

CNPJ nº 13.880.257/0001-27, PÇA. DOM MÁXIMO, 384 - TÉRREO - CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS


**Certidão Negativa de Débitos para com a
Fazenda Municipal
Nº 4703/2021**

Razão Social: **M.V ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**
Nome Fantasia: **MV ENGENHARIA**
CNPJ: **33.564.387/0001-68**
Inscrição: **5.4.001681**
Endereço: **RUA SILVA JARDIM, 12 - ANDAR 1 - CENTRO, XIQUE-XIQUE -
BA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente, é certificado que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS** em nome da EMPRESA acima citada para este município.

Esta Certidão foi emitida em 02/08/2021 com base no Código Tributário Nacional lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 31/10/2021.


EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Tributação
Data: 02/08/2021

48090100000000000054001681





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 33.564.387/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:31:25 do dia 28/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2022.
Código de controle da certidão: **F12E.978A.63D5.74E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 02/08/2021 15:43

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20213091491

RAZÃO SOCIAL	
MVGENGHARIA E CONTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.564.387/0001-68

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/08/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Certidão nº: 15980954/2021
Expedição: 18/05/2021, às 17:24:48
Validade: 13/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.564.387/0001-68, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br



Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUE

CNPJ nº 13.880.257/0001-27, PÇA. DOM MÁXIMO, 384 - TÉRREO - CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS


**Certidão Negativa de Débitos para com a
Fazenda Municipal
Nº 4703/2021**

Razão Social: **M.V ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**
Nome Fantasia: **MV ENGENHARIA**
CNPJ **33.564.387/0001-68**
Inscrição: **5.4.001681**
Endereço: **RUA SILVA JARDIM, 12 - ANDAR 1 - CENTRO, XIQUE-XIQUE -
BA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente, é certificado que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS** em nome da EMPRESA acima citada para este município.

Esta Certidão foi emitida em 02/08/2021 com base no Código Tributário Nacional lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 31/10/2021.


EDVALDO F. SANTOS
Diretor do Departamento de Tributos

4809010000000000000054001681



 PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Praça Dom Máximo, 384, centro - Xique-Xique/BA. CEP: 47.400-000 CONTRATADA: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 ART Nº: BA022109985 CC Nº: 003/2021 CONTRATO Nº: 000/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 12 MESES ADITIVO DE PRAZO: TERMINO PREVISTO: 31/03/2022 INÍCIO: 31/03/2021 TOTAL CONTRATADO: R\$ 316.745,08 MED. ATÉ O DIA: R\$ 237.504,60 SALDO: R\$ 79.240,48 MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 63.163,79 SALDO GERAL: R\$ 16.076,69									
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PROPOSTO		QUANTIDADES		VALORES		SALDO GERAL	SALDO GERAL
		Unid	Quant	Unid	Quant	Saldo Anterior	Saldo Geral		
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m²	21,20			16,77	4,43	388,73	102,69
1.2	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	7,20			7,20		59,62	
1.3	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m²	4,90			4,90		58,51	
	Subtotal					R\$ 609,55		102,69	102,69
MOVIMENTO DE TERRA/CARGAS E TRANSPORTES									
2.1	Escarpação manual de vala ou cava em material af_1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	3,68			R\$ 122,66		122,66	
2.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, af_04/2016	m³	42,13			R\$ 1.164,11		1.164,11	
	Subtotal					R\$ 1.286,77			
FUNDAÇÃO									
3.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisado 07/2015	m²	23,48			R\$ 1.236,05		1.236,05	
3.2	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	239,93			R\$ 1.945,83		1.945,83	
3.3	Aço CA - 60 Ø 4,7 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	64,79			R\$ 487,22		487,22	
3.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	6,64			R\$ 2.834,15		2.834,15	
	Subtotal					R\$ 6.503,25			
ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA									
4.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisado 07/2015	m²	35,97			R\$ 1.893,82		1.893,82	
4.2	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	321,44			R\$ 2.606,88		2.606,88	
4.3	Aço CA - 60 Ø 4,7 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	114,12			R\$ 858,18		858,18	
4.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	4,86			R\$ 2.074,39		2.074,39	
	Subtotal					R\$ 7.433,27			
ALVENARIAS DE FECHAMENTO									
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x13cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af_05/2014	m²	264,96			R\$ 49,80		251,14	
	Subtotal					R\$ 13.195,01			
LAJES PRÉ-FABRICADAS E OUTROS									
6.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interior 30cm, h=12cm, el. enchimento em EPS 16den, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm	m²	23,95			R\$ 2.730,30		2.730,30	
6.1	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm, af_06/2018	m²	23,95			R\$ 1.019,07		1.019,07	
	Subtotal					R\$ 3.749,37		3.749,37	1.019,07
REVESTIMENTO DE PAREDE/ACABAMENTO									
7.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de adib) e estruturas de concreto de fechada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af_06/2014	m²	529,92			R\$ 3.068,24		2.908,20	160,04
7.2	Enboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicação manualmente em panos de fechada com presença de vãos, espessura de 25 mm, af_06/2014	m²	529,92			R\$ 17.885,81		18.952,90	932,90
7.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com juntas de dilatação de 2x3x5 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura máxima de 2,40m, af_06/2014	m²	176,57			R\$ 6.935,08		4.956,62	0,00

MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA
Secretário Municipal de S
Creto 003/2021

ABINIAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 9066484

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93068

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE											
Praça Dom Máximo, 384, centro - Xique-Xique/BA.											
CEP: 47.400-000											
CONTRATADA : M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI											
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL MILETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.											
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03											
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/05/21 a 14/06/21											
ART. Nº: 003/2021											
CONTRATO Nº: 080/2021											
PRazo DE EXECUÇÃO: 12 MESES											
ADITIVO DE PRAZO:											
TERMINO PREVISTO: 31/03/2022											
INÍCIO: 31/03/2021											
TOTAL CONTRATADO: R\$ 316.745,08											
MED. ATERROS: R\$ 337.504,50											
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 63.163,79											
SALDO GERAL: R\$ 16.076,69											
VALORES											
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PROPOSTO			QUANTIDADES			VALORES			
		UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	QUANTIDADES ANTERIORES	QTD.	VAL. UNIT.	ACUMULADO ANTERIORES	SALDO GERAL	VALOR ATUAL	
7.4	Revestimento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm	m²	276,37	R\$ 6,07	R\$ 1.071,78	50,19	126,38	767,13	304,65	6.816,69	0,00
8	REVESTIMENTO DE PISO			Subtotal							0,00
8.1	Lustro de concreto, preparo mecânico, inclusive aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	47,11	R\$ 326,78	R\$ 15.394,61	47,11		15.394,61			0,00
8.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. c/ c/ço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	27,82	R\$ 14,71	R\$ 409,23	9,80	18,02	265,07	265,07		0,00
8.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalte extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m², af. 05/2014	m²	27,82	R\$ 44,04	R\$ 1.225,19	9,80	18,02	793,60	793,60		0,00
8.4	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmerilh 400 e encerramento, exclusão argamassa de regularização, aplicado	m²	50,96	R\$ 39,26	R\$ 2.000,69		50,96	2.000,69	2.000,69		0,00
8.5	Polimento de piso de alta resistência, novo 81	m²	50,96	R\$ 14,08	R\$ 748,09		50,96	748,09	748,09		0,00
8.6	Regularização de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm	m²	27,82	R\$ 7,03	R\$ 195,57	9,80	18,02	126,68	126,68		0,00
8.7	Ereção de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af. 07/2016	m²	8,90	R\$ 258,30	R\$ 2.298,87		8,90	2.298,87	2.298,87		0,00
8.8	Guia (meio fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura, af. 06/2016	M	44,40	R\$ 21,11	R\$ 937,28		44,40	937,28	937,28		0,00
8.9	Soldado em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	9,90	R\$ 62,87	R\$ 622,41	1,80	8,10	113,17	509,25	509,25	0,00
8.10	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	197,27	R\$ 11,54	R\$ 2.276,50	197,27		2.276,50	2.276,50		0,00
8.11	Verniz sintético brilhante, 2 demãos	m²	197,27	R\$ 10,03	R\$ 1.978,62	197,27		1.978,62	1.978,62		0,00
9	ESQUADRIAS/GRADIS/DIVISÓRIAS			Subtotal							748,09
9.1	Kit de porta de madeira para janela, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens: inclusive dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, af. 12/2019	UN	3,00	R\$ 460,91	R\$ 1.382,73	2,00	1,00	921,82	460,91	460,91	1.288,44
9.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens: inclusive dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, af. 12/2019	UN	6,00	R\$ 429,48	R\$ 2.576,88		6,00	2.576,88	3,00	2.576,88	1.288,44
9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens: inclusive dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, af. 12/2019	UN	6,00	R\$ 365,12	R\$ 2.190,72		6,00	2.190,72	2.190,72		0,00
9.4	Porta em madeira compensada (Vidro), lisa, semi-oca, 160 x 210 cm, 2 folhas, tipo vai-vem, com visor (40x70cm), inclusive batentes e ferragens	UN	1,00	R\$ 878,19	R\$ 878,19		1,00	878,19	878,19		0,00
9.5	Bate-maca de 800x150mm em chapão de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-arrachando	UN	4,00	R\$ 43,29	R\$ 173,16		4,00	173,16	173,16		0,00
9.6	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação, af. 12/2019	m²	5,67	R\$ 390,24	R\$ 2.212,66		5,67	2.212,66	2.212,66		0,00
9.7	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm	m²	6,05	R\$ 269,54	R\$ 1.630,72		6,05	1.630,72	1.630,72		0,00
9.8	Janela em alumínio, cor: forca, tipo basculante, completa, exclusive vidros	m²	2,10	R\$ 285,67	R\$ 562,21	0,24	1,86	499,73	64,48	499,73	1.630,72
10	PINTURA			Subtotal							2.919,16
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m²	506,61	R\$ 2,10	R\$ 1.063,88	139,38	367,23	771,18	57,69	771,18	550,03
10.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	506,61	R\$ 13,00	R\$ 6.585,93	139,38	367,23	309,54	57,69	309,54	4.024,02
10.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m²	506,61	R\$ 11,40	R\$ 5.775,35	139,38	367,23	164,67	57,69	164,67	4.024,02
10.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - Rev 01	m²	13,82	R\$ 14,17	R\$ 195,83	13,82		195,83	202,56	4.186,42	1.877,24
10.5		m²							13,82		195,83

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA
Decreto 003/2021

ALCAIDES SOTERO BARBOSA
Engenheiro Civil
CREA: 5060484
MATRÍCULA: 7851

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.604.087/0001-68
Resp. Téc. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Praça Dom Máximo, 384, centro - Xique-Xique/BA. CEP: 47.400-000									
CONTRATADA: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI OBRAS: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.									
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/05/21 a 14/06/21 ART Nº: 04021009455 CC Nº: 003/2021 CONTRATO Nº: 090/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES ADITIVO DE PRAZO: TERMINO PREVISTO: 31/03/2022									
VALORES TOTAL CONTRATADO: R\$ 316.745,08 MED. ANTERIORES: R\$ 337.504,60 SALDO: R\$ 79.240,48 MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 63.163,79 SALDO GERAL: R\$ 16.076,69									
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QTD	VAL. UNID	VAL. TOTAL	QUANTIDADES ANTERIORES	VALOR	QUANTIDADES	VALOR
10.5	Pintura a óleo, 2 demãos.	m²	23,31	R\$ 19,40	R\$ 452,21	3,78	19,53	19,53	378,88
	Subtotal				R\$ 4.073,20				10.306,30
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/PROVISÓRIAS:								6.551,29
11.1	Ponto de água fria embutido, 1/2" material pvc rígido roscaável Ø 3/4"	un	5,00	R\$ 98,77	R\$ 493,85	2,00	3,00	3,00	296,31
11.2	Caixa de inspeção Ø80x80cm em alvenaria - execução	UN	6,00	R\$ 99,95	R\$ 599,70	1,00	5,00	5,00	499,75
11.3	Registro de pressão bruto, latão, roscaável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água, af. 12/2014	UN	9,00	R\$ 41,85	R\$ 376,65	2,00	7,00	7,00	292,95
11.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscaável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água, af. 12/2014	UN	2,00	R\$ 32,04	R\$ 64,08		2,00	2,00	64,08
11.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (barridos, metidos, ralo sifonado, etc.)	un	4,00	R\$ 48,45	R\$ 193,80	2,00	2,00	2,00	96,90
11.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00	R\$ 64,81	R\$ 259,24	2,00	2,00	2,00	129,62
11.7	Vaso sanitário 2/3 de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TK ou similar, conj. de fixação DECA 913 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	4,00	R\$ 186,78	R\$ 747,12	2,00	2,00	2,00	373,56
11.8	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 03/2020	UN	4,00	R\$ 137,87	R\$ 551,48	2,00	2,00	2,00	275,74
11.9	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af. 01/2020	UN	7,00	R\$ 41,45	R\$ 290,15	2,00	5,00	5,00	207,25
11.10	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 passadas (v=3390 litros)	un	1,00	R\$ 2.352,83	R\$ 2.352,83	1,00			2.352,83
11.11	Somidoiro painéis com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	1,00	R\$ 1.254,10	R\$ 1.254,10	1,00			1.254,10
11.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	M	79,25	R\$ 15,27	R\$ 1.210,15	51,14	28,11	28,11	429,24
11.13	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	M	60,75	R\$ 20,21	R\$ 1.227,76	13,65	47,10	47,10	951,89
11.14	TE, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	UN	5,00	R\$ 5,03	R\$ 25,15	5,00			25,15
11.15	Tubo pvc rígido soldável manrom Ø 40 mm, d = 20 mm (1/2")	m	62,30	R\$ 6,13	R\$ 381,90	21,43	40,87	40,87	250,53
11.16	TE de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	UN	7,00	R\$ 13,56	R\$ 94,92	7,00			94,92
11.17	Tubo pvc rígido soldável manrom Ø 40 mm, d = 25 mm (3/4")	m	46,75	R\$ 8,61	R\$ 402,52	22,98	23,77	23,77	204,66
11.18	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	UN	5,00	R\$ 9,21	R\$ 46,05	5,00			46,05
11.19	TE, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	UN	4,00	R\$ 5,21	R\$ 20,84	2,00	2,00	2,00	10,42
11.20	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	UN	8,00	R\$ 4,93	R\$ 39,44	4,00	4,00	4,00	19,72
11.21	Curva em cobre, dn 22 mm, 45 graus, sem anel de solda, bolsa x bolsa, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação. af. 01/2016	UN	6,00	R\$ 14,85	R\$ 89,10	2,00	4,00	4,00	59,40
11.22	Chuveiro plástico sem registro	un	8,00	R\$ 16,71	R\$ 133,68	8,00			133,68
11.23	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	UN	13,00	R\$ 6,72	R\$ 87,36	2,00	11,00	11,00	95,92
11.24	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	UN	9,00	R\$ 8,55	R\$ 76,95	2,00	7,00	7,00	59,85
	Subtotal				R\$ 11.094,42				4.461,47
									990,23

MICHEL DA CRUZ OLIV
Secretário Municipal de S
Decreto 003/2021

ABIMEL SOTERO BARBOSA
Engenheiro Civil
CREA: 600248
MATRICULA: 7651

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.841.887/0001-68
Resp: Tec/Marcos A. Vargas
Eng. CIVIL CREA/BA: 93058

PROPOSTA				QUANTIDADES				VALORES			
ITEM	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	QUANTIDADE ANTERIORES	QUANTIDADE	SALDO GERAL	QUANTIDADE ANTERIORES	SALDO	QUANTIDADE	SALDO GERAL
RESERVAÇÃO DE SERVIÇOS											
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO											
12.1	un	1,00	R\$ 99,61	R\$ 99,61		1,00	1,00		99,61		99,61
12.2	UN	2,00	R\$ 78,50	R\$ 157,00	2,00			157,00			
12.3	UN	5,00	R\$ 64,47	R\$ 322,35	5,00			322,35			
12.4	UN	5,00	R\$ 48,35	R\$ 241,75	5,00			241,75			
12.5	UN	5,00	R\$ 11,73	R\$ 58,65		5,00	5,00		58,65		58,65
12.6	M	94,50	R\$ 8,01	R\$ 756,95	90,00	44,50	44,50	400,50	356,45		0,00
12.7	un	41,00	R\$ 10,99	R\$ 450,59	20,00	21,00	21,00	219,80	230,79		
12.8	M	200,00	R\$ 2,77	R\$ 554,00	100,00	100,00	100,00	277,00	277,00		
12.9	M	150,00	R\$ 4,42	R\$ 663,00	100,00	50,00	50,00	442,00	221,00		
12.10	M	440,00	R\$ 5,03	R\$ 2.213,20	380,00	60,00	60,00	2.287,60	361,20		
12.11	M	100,00	R\$ 9,29	R\$ 929,00	100,00			929,00			
12.12	UN	14,00	R\$ 20,51	R\$ 287,14		14,00	14,00		287,14		287,14
12.13	UN	5,00	R\$ 34,02	R\$ 170,10		5,00	5,00		170,10		170,10
12.14	UN	12,00	R\$ 40,63	R\$ 487,56		12,00	12,00		487,56		487,56
12.15	UN	10,00	R\$ 21,61	R\$ 216,10		10,00	10,00		216,10		216,10
12.16	un	60,00	R\$ 12,77	R\$ 766,20	60,00			766,20			
12.17	un	40,00	R\$ 40,98	R\$ 1.639,60	40,00			1.639,60			
12.18	UN	52,00	R\$ 34,79	R\$ 1.809,08	23,00	29,00	29,00	800,17	1.008,91		1.008,91
12.19	un	60,00	R\$ 31,55	R\$ 1.893,00	60,00			1.893,00			
12.19	UN	17,00	R\$ 8,58	R\$ 145,86	17,00			145,86			
Subtotal				R\$ 14.396,34					3.774,51	1.446,44	2.328,08
COBERTURAS/FORROS											
13.1	m²	153,09	R\$ 39,33	R\$ 6.021,03	39,53	113,56	113,56	1.554,85	4.466,18		0,00
13.2	m²	174,55	R\$ 73,10	R\$ 12.759,61	174,55			12.759,61			
13.3	m²	152,06	R\$ 76,72	R\$ 11.666,04	98,29	113,77	113,77	2.837,65	8.728,40		0,00
13.4	m	48,95	R\$ 15,07	R\$ 737,68	48,95			737,68			
13.5	m	22,00	R\$ 56,52	R\$ 1.243,44	6,00	16,00	16,00	904,32	872,80		727,68
Subtotal				R\$ 14.396,34					3.774,51	1.446,44	2.328,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Praça Dom Máximo, 384, centro - Xique-Xique/BA.
CEP: 47.400-000

CONTRATADA: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/05/21 a 14/06/21
ART Nº: 003/2021
CC Nº: 003/2021
CONTRATO Nº: 003/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
ADITIVO DE PRAZO:
TERMINO PREVISTO: 31/03/2022

INÍCIO: 31/03/2021
TOTAL CONTRATADO: R\$ 316.745,08
MED. ANTERIORES: R\$ 237.504,60
SALDO: R\$ 79.240,48
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 63.163,79
SALDO GERAL: R\$ 16.076,69

ARIMAEL SOTERO BARBOSA
Engenheiro Civil
Régua: 906048A
Inscrição: 7851

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CIHELDA CRUZ OLIVEIRA
Decreto 003/2021

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ABIMAEI SOTERO BARBOSA
CR 90: Engenheiro Civil
CREA: 006048A
1951

CADERNO DE DIÁRIOS DE OBRA					
	PROPRIETÁRIO:	Secretaria de Obras - Prefeitura Municipal de Xique-Xique			REV.
	EMPREENHIMENTO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20			
	RESPONSÁVEL:	Diretoria de Infraestrutura - PMXX			FOLHA 1/31
DADOS CADASTRAIS:					
CONTRATO Nº: 080/2021					
EXECUTANTE: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA,					
LOCAL: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.					
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					
Caderno de Diário de Obra referente ao mês de: Maio/Junho de 2021					
DE: 16/05/2021 A 14/06/2021					
REV.	RESUMO DAS REVISÕES				
0	EMISSÃO INICIAL - Aprovação do Caderno de Diário de Obra Referente ao mês de maio/junho de 2021				
REVISÕES:	REV. 00	REV. 01	REV. 02	REV. 03	REV. 04
EMISSÃO DATA:	14/06/2021				
EXECUÇÃO:					
APROVAÇÃO:					


MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058


ABIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 80604BA
MATRICULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX							
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI				Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.				RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 046	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	16/05/21	
31/03/2021	31/03/2022	365	46	319	PERÍODO:	Maio	
ESCOPO					SEMANA:	domingo	
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00	
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO	
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta	
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00	
NOITE					0,00	Sexta Feir	
						07:00 hs as 17:00	
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.						
1.1	A contratada informa que não trabalhou no dia 16/05/2021						
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
1.7							
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA							
Função	Efetivo Norm.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas
Ajudante	0	0	0	0,00	Gerente - Obra	0	0
Pedreiro	0	0	0	0,00	Fiscal - Obra	0	0
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00			
TOTAL	0	0	0	0,00			
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	0	0
			0,00		TOTAL EFETIVO	0	0
					MOD	0	VIAS: 3
					MOI	0	DINF: 2
					TOTAL	0	EMPRESA: 1
RESPONSÁVEL - OBRA:				FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:				ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA				RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº	03	
					DATA:	14/06/2021	

MV ENGENHARIA
CNPJ: 23.564.388/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

ABIMAR SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604RA
MATRÍCULA: 7651

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº		
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº.: RDO-DINF-M.V.ENG. 047		
INÍCIO		TÉRMINO		PREVISTO		DECORRIDOS		RESTANTE	
31/03/2021		31/03/2022		365		47		318	
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM		CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM		PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS		DURAÇÃO	
MANHA		X						0,00	
TARDE		X						0,00	
NOITE								0,00	
HORA		07:00		as		17:00		SEGUNDA-FEIRA	
ITEM		GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)							
1		TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1		Execução do Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019							
1.2		Execução da Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019							
1.3		Instalação Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019							
1.4		Execução do Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014							
1.5		Execução de passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016							
1.6		Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016							
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA		MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA							
Função		Efetivo Nom.		Faltas		Efetivo do dia		Horas	
Ajudante		5		0		5		45,00	
Pedreiro		3		0		3		27,00	
Armador		1		0		1		9,00	
Carpinteiro		1		0		1		9,00	
Pintor		0		0		0		0,00	
Eletricista		0		0		0		0,00	
Encanador		1		0		1		9,00	
Encarregado		0		0		0		0,00	
Serralheiro		2		0		2		18,00	
TOTAL		13		0		13		117,00	
EQUIPAMENTOS		QT		AQUISIÇÃO		DIÁRIAS		0,00	
TOTAL		1		0		1		0,00	
TOTAL EFETIVO		13		VIAS:		3			
MOD		1		DINF		2			
TOTAL		14		EMPRESA		1			
RESPONSÁVEL - OBRA:		FISCALIZAÇÃO - DINF							
ASS:		ASS:							
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA		RESPONSÁVEL - DINF/PMXX							
Revisão:		Elaborado Por:		Setor:		Reg. Fotográfico - Nº		03	
		MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS		Planejamento		DATA:		14/06/2021	

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ABRIL SOTERO BARBOSA
Engenheiro Civil
CREA: 50604BA
Nº 123456789

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 048	
INÍCIO	TERMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	18/05/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	48	317	PERÍODO:	Maio		
ESCOPO					SEMANA:	terça-feira		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feia		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Execução do Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019							
1.2	Execução da Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019							
1.3	Instalação Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019							
1.4	Execução do Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014							
1.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016							
1.6	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016							
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	1	0	1	9,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	2	0	2	18,00				
	0	0	0	0,00				
TOTAL	13	0	13	117,00				
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1
			0,00		TOTAL EFETIVO	13		3
					MOD	1		2
					MOI	14		1
					TOTAL			
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 03		
						DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 38.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ABIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 50804BA
MATRÍCULA: 7261

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 049	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	19/05/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	49	316	PERÍODO:	Maio		
					SEMANA:	quarta-feira		
					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
ESCOPO	CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Execução do Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019							
1.2	Execução da Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019							
1.3	Instalação Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019							
1.4	Execução do Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014							
1.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016							
1.6	Guia (melo-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016							
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	1	0	1	9,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	2	0	2	18,00				0,00
	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	13	0	13	117,00	TOTAL	1	0	1
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO			0,00
				0,00	MOD	13	VIAS:	3
					MOI	1	DINF	2
					TOTAL	14	EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº	03	
						DATA:	14/06/2021	

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.464.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ABIMEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 0080494
INSTR. CULA: 7551

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX									
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº.:	RDO-DINF-M.V.ENG. 050		
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	20/05/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	50	315	PERÍODO:	Maio			
ESCOPO					SEMANA:	quinta-feira			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00			
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE			
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução de passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016								
1.2	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016								
1.3	Execução do Revestimento cerâmico para paredes Internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014								
1.4	Execução da Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm								
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encenador	1	0	1	9,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	2	0	2	18,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	13	0	13	117,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO				0,00
				0,00	MOD	13			3
					MOI	1			2
					TOTAL	14			1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por:				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº			
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Planejamento	03			
						DATA: 14/06/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 36.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

ABRAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
INSTR. CREA: 785

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 051	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	21/05/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	51	314	PERÍODO:	Maio		
ESCOPO					SEMANA:	sexta-feira		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016							
1.2	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016							
1.3	Execução do Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014							
1.4	Execução da Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm							
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	10	0	10	90,00				0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1
				0,00	TOTAL EFETIVO			0,00
					MOD	10		VIAS: 3
					MOI	1		DINF: 2
					TOTAL	11		EMPRESA: 1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 03		
						DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-63
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

ABRAHAM SOTERO BARBOSA
Eng. Civil CREA: 90604/BA

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 052	
INÍCIO	31/03/2021	TÉRMINO	31/03/2022	PREVISTO	365	DATA:	22/05/21	
				DECORRIDOS	52	PERÍODO:	Maio	
				RESTANTE	313	SEMANA:	sábado	
ESCOPO	CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	Sexta Feira		
NOITE						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Execução de passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016							
1.2	Guia (meio-fo) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016							
1.3	Execução do Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014							
1.4	Execução da Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm							
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				
	0	0	0	0,00				
TOTAL	10	0	10	90,00	TOTAL	1	0	1
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO	10	VIAS:	3
				0,00	MOD	1	DINF	2
					TOTAL	11	EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 03		
					Planejamento	DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 23.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

ABRIL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 053	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	REstante	DATA:	23/05/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	53	312	PERÍODO:	Maio		
ESCOPO					SEMANA:	domingo		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feirã		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	A contratada informa que não trabalhamos no dia 23/05/21							
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	0	0	0	0,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	0	0	0	0,00	Fiscal - Obra	0	0	0
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				
TOTAL	0	0	0	0,00				
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	0	0	0
				0,00	TOTAL EFETIVO	0	0	0
					CONTROLE - CQ			
					MOD	0	VIAS:	3
					MOI	0	DINF	2
					TOTAL	0	EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por:				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Planejamento	03		
						DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 13.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ABIMAR SOUZA BARBOSA
Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 705

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 054	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	DATA: 24/05/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	54	311	SEMANA:	Maio		
ESCOPO					CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.			
CONDICÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Execução do Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes, pf 06/2014							
1.2	Execução do Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado							
1.3	Instalação Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm							
1.4	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm							
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				
	0	0	0	0,00				
TOTAL	10	0	10	90,00	TOTAL	1	0	1
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO			
				0,00	MOD	10		
					MOI	1		
					TOTAL	11		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº	03	
						DATA:	14/06/2021	

MV ENGENHARIA
CNPJ: 29.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ASIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 906048A
MATR. CULA: 7851

 XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX				 M.V. ENGENHARIA RUA JOSE ALVES DA SILVA, 100 - JARDIM BELLA VISTA - FLORESTA - RJ													
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI				Contrato Nº: 080/2021													
LOCAL:		MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.				RDO Nº.: RDO-DINF-M.V.ENG. 055													
INÍCIO		TÉRMINO		PREVISTO		DATA: 25/05/21													
31/03/2021		31/03/2022		365		PERÍODO: Maio													
				DECORRIDOS		SEMANA: terça-feira													
				55		HORÁRIO: 07:00 as 17:00													
				REstante															
				310															
ESCOPO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.																			
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM		CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM		PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS													
DURAÇÃO		HORAS PARALISADAS		REGIME DE TRABALHO															
MANHA		X				Segunda a Quinta													
TARDE		X				07:00 hs as 17:00													
NOITE						Sexta Feira													
						07:00 hs as 17:00													
ITEM		GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRETA												
1		TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.																	
1.1		Execução do Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado																	
1.2		Instalação das esquadrias em madeira (portas)																	
1.3																			
1.4																			
1.5																			
1.6																			
1.7																			
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA											
Função		Efetivo Nom.		Faltas		Efetivo do dia		Horas		Função		Efetivo Nominal		Faltas		Efetivo do dia		Horas	
Ajudante		4		0		4		36,00		Gerente - Obra		0		0		0		0,00	
Pedreiro		2		0		2		18,00		Fiscal - Obra		1		0		1		0,00	
Armador		0		0		0		0,00		T. de Segurança		0		0		0		0,00	
Carpinteiro		3		0		3		27,00		A. de Planejamento		0		0		0		0,00	
Pintor		0		0		0		0,00		Estagiário Eng.		0		0		0		0,00	
Eletricista		0		0		0		0,00		Aux. Administ.		0		0		0		0,00	
Encanador		0		0		0		0,00		Motorista		0		0		0		0,00	
Encarregado		0		0		0		0,00		Apostador		0		0		0		0,00	
Serralheiro		0		0		0		0,00										0,00	
		0		0		0		0,00										0,00	
TOTAL		9		0		9		81,00		TOTAL		1		0		1		0,00	
EQUIPAMENTOS		QT		AQUISIÇÃO		DIÁRIAS				TOTAL EFETIVO		1		0		1		0,00	
								0,00		MOD		9		VIAS:		3			
										MOI		1		DINF		2			
										TOTAL		10		EMPRESA		1			
RESPONSÁVEL - OBRA:										FISCALIZAÇÃO - DINF									
ASS:										ASS:									
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA										RESPONSÁVEL - DINF/PMXX									
Revisão:		Elaborado Por:				Sector:				Reg. Fotográfico - N°				03					
		MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Planejamento				DATA:									

MV/ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ESMAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 906048A
MATRICULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 056	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	26/05/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	56	309	PERÍODO:	Maio		
ESCOPO					SEMANA:	quarta-feira		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Continuação do passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016							
1.2	Continuação da Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016							
1.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014							
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominat	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	3	0	3	27,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	13	0	13	117,00				0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1
				0,00				0,00
					TOTAL EFETIVO	CONTROLE - CQ		
					MOD	13	VIAS:	
					MOI	1	DINF	
					TOTAL	14	EMPRESA	
							1	
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:					Setor:			
Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS					Reg. Fotográfico - Nº 03			
					DATA: 14/06/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.864.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 80604BA
MATRÍCULA: 7851

		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX						
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Contrato Nº		080/2021	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.			RDO Nº:		RDO-DINF-M.V.ENG. 057	
INÍCIO		TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:		27/05/21
31/03/2021		31/03/2022	365	57	308	PERÍODO:		Maio
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.						
CONDICÕES DO TEMPO		BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO	
MANHÃ		X				0,00	Segunda a Quinta	
TARDE		X				0,00	07:00 hs as 17:00	
NOITE							Sexta Feira	
							07:00 hs as 17:00	
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Continuação do passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016							
1.2	Continuação da Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016							
1.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014							
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	3	0	3	27,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	13	0	13	117,00	TOTAL	1	0	1
EQUIPAMENTOS				QT	AQUISIÇÃO DIÁRIAS			
					0,00			
					TOTAL EFETIVO			
					MOD			
					MOI			
					TOTAL			
					14			
					EMPRESA			
					1			
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:					Setor:			
Elaborado Por:					Reg. Fotográfico - Nº			
MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS					03			
					DATA:			
					14/06/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.389/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93068

ADIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 9560484
CRECUB: 1251

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 058	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	28/05/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	58	307	PERÍODO:	Maio		
ESCOPO					SEMANA:	sexta-feira		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Continuação do passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016							
1.2	Continuação da Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016							
1.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014							
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	3	0	3	27,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	13	0	13	117,00	TOTAL	1	0	1
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO	13	VIAS:	3
				0,00	MOD	1	DINF	2
					TOTAL	14	EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVELS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por:			Setor:	Reg. Fotográfico - Nº	03		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS			Planejamento	DATA:	14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.592.361/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA												
		DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX																	
EMPRESA:		M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº 080/2021												
LOCAL:		MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº.: RDO-DINF-M.V.ENG. 059												
INÍCIO		TÉRMINO		PREVISTO		DECORRIDOS		RESTANTE											
31/03/2021		31/03/2022		365		59		306											
ESCOPO		CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.																	
CONDIÇÕES DO TEMPO		BOM		CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM		PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS		DURAÇÃO											
MANHÃ		X						0,00											
TARDE		X						0,00											
NOITE								0,00											
REGIME DE TRABALHO		Segunda a Quinta																	
		07:00 hs as 17:00																	
		Sexta Feia																	
		07:00 hs as 17:00																	
ITEM		GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)							ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE										
1		TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.																	
1.1		Continuação do passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016																	
1.2		Continuação da Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016																	
1.3		Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014																	
1.4																			
1.5																			
1.6																			
1.7																			
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA										MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA									
Função		Efetivo Norm.		Faltas		Efetivo do dia		Horas		Função		Efetivo Norm.		Faltas		Efetivo do dia		Horas	
Ajudante		5		0		5		45,00		Gerente - Obra		0		0		0		0,00	
Pedreiro		3		0		3		27,00		Fiscal - Obra		1		0		1		0,00	
Armador		1		0		1		9,00		T. de Segurança		0		0		0		0,00	
Carpinteiro		1		0		1		9,00		A. de Planejamento		0		0		0		0,00	
Pintor		3		0		3		27,00		Estagiário Eng.		0		0		0		0,00	
Eletricista		0		0		0		0,00		Aux. Administ.		0		0		0		0,00	
Encarregado		0		0		0		0,00		Motorista		0		0		0		0,00	
Serralheiro		0		0		0		0,00		Apontador		0		0		0		0,00	
TOTAL		13		0		13		117,00		TOTAL		1		0		1		0,00	
EQUIPAMENTOS		QT		AQUISIÇÃO		DIÁRIAS		0,00		TOTAL EFETIVO		13		VIAS:		3			
										MOD		1		DINF		2			
										TOTAL		14		EMPRESA		1			
RESPONSÁVEL - OBRA:										FISCALIZAÇÃO - DINF									
ASS:										ASS:									
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA										RESPONSÁVEL - DINF/PMXX									
Revisão:		Elaborado Por:				Setor:		Reg. Fotográfico - Nº		03		DATA:		14/06/2021					
		MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Planejamento													

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.464.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 5-01-0484
MATRÍCULA: 7651

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 060	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	DATA: 30/05/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	60	305	SEMANA:	Maio		
ESCOPO					HORÁRIO: 07:00 as 17:00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.								
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Fei		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	A contratada informa que não trabalhamos no dia 30/05/21							
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	0	0	0	0,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	0	0	0	0,00	Fiscal - Obra	0	0	0
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
	6	0	6	54,00				0,00
TOTAL	6	0	6	54,00				0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	0	0	0
			0,00		TOTAL EFETIVO	6		0,00
					MOD	6		VIAS: 3
					MOI	0		DINF: 2
					TOTAL	6		EMPRESA: 1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:					Setor: Reg. Fotográfico - Nº 03			
Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS					DATA: 14/06/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.854.087/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

ABIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
		DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX						
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 061	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	31/05/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	61	304	PERÍODO:	Maio		
ESCOPO					SEMANA:	segunda-feira		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feia		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014							
1.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							
1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017							
1.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014							
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	3	0	3	27,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	13	0	13	117,00	TOTAL	1	0	1
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO			0,00
				0,00	MOD	13		VIAS: 3
					MOI	1		DINF: 2
					TOTAL	14		EMPRESA: 1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº	03	
						DATA:	14/06/2021	

MV ENGENHARIA
CNPJ: 32.554.387/0001-68
Resp. Téc. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93653

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 506048A
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
		DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX						
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 062	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	DATA: 01/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	62	303	SEMANA:	Junho		
					HORÁRIO:	terça-feira		
						07:00 as 17:00		
ESCOPO								
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.								
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feita		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Aplicação de fundo setador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014							
1.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							
1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017							
1.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014							
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. do Planejamento	0	0	0
Pintor	3	0	3	27,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				
	0	0	0	0,00				
TOTAL	13	0	13	117,00				
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1
			0,00					
					TOTAL EFETIVO	CONTROLE - CQ		
					MOD	13	VIAS: 3	
					MOI	1	DINF	
					TOTAL	14	EMPRESA 2	
							EMPRESA 1	
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº	03	
						DATA:	14/06/2021	

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ASIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 60604BA
MATRÍCULA: 7651

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 063	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	02/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	63	302	PERÍODO:	Junho		
ESCOPO					SEMANA:	quarta-feira		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014							
1.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							
1.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014							
1.4	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014							
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				
TOTAL	10	0	10	90,00				
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1
			0,00		TOTAL EFETIVO			
					MOD	10		
					MOI	1		
					TOTAL	11		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº	03	
						DATA:	14/06/2021	

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.664.381/0001-63
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93000

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 50604/BA
MATRÍCULA: 7051

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 064	
INÍCIO	31/03/2021	TERMINO	31/03/2022	PREVISTO	365	DATA:	03/06/21	
				DECORRIDOS	64	PERÍODO:	Junho	
				RESTANTE	301	SEMANA:	quinta-feira	
ESCOPO	CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.							
CONDICÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feir		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014							
1.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							
1.3	Avenaria de vedação de blocos cerâmicos torcidos na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014							
1.4	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014							
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Norm.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	3	0	3	27,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	13	0	13	117,00	TOTAL	1	0	1
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO			CONTROLE - CQ
			0,00		MOD	13		VIAS:
					MOI	1		DINF
					TOTAL	14		EMPRESA
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 03		
						DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93658

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 936048A
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 065	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	DATA: 04/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	65	300	SEMANA:	Junho		
ESCOPO					HORÁRIO: 07:00 as 17:00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.								
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014							
1.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							
1.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014							
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	3	0	3	27,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
TOTAL	13	0	13	117,00				
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS					
				0,00				
TOTAL					TOTAL EFETIVO			
					MOD 13			
					MOI 1			
					TOTAL 14			
					EMPRESA 1			
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:					Reg. Fotográfico - Nº 03			
Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS					Setor: Planejamento			
					DATA: 14/06/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: S...

ABIMAELO SOTERO BARGOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 93894/BA
INSCRIÇÃO Nº: 115

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 066	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	REstante	DATA:	05/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	66	299	PERÍODO:	Junho		
ESCOPO					SEMANA:	sábado		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014							
1.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014							
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apointador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	10	0	10	90,00	TOTAL	1	0	1
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS		TOTAL EFETIVO			CONTELORE - CQ
				0,00	MOD	10		VIAS:
					MOI	1		DINF
					TOTAL	11		EMPRESA
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por:				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº		
	MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Planejamento	03		
						DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ABIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 93604/BA
14/06/2021

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 067	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	06/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	67	298	SEMANA:	Junho		
ESCOPO					HORÁRIO: 07:00 as 17:00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.								
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	Sexta Feita		
NOITE						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	A contratada informa que não trabalhamos no dia 06/06/21							
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	0	0	0	0,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	0	0	0	0,00	Fiscal - Obra	0	0	0
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	0	0	0	0,00	TOTAL	0	0	0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO	0		0,00
				0,00	MOD	0		VIAS: 3
					MOI	0		DINF: 2
					TOTAL	0		EMPRESA: 1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 03		
						DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 32.664.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ASIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 908043BA
INSCRIÇÃO: 7561

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF.M.V.ENG. 068	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	07/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	68	297	PERÍODO:	Junho		
ESCOPO					SEMANA:	segunda-feira		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Execução das instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais							
1.2	Execução das instalações elétricas							
1.3	Instalação do Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p							
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	2	0	2	18,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	12	0	12	108,00				0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1
			0,00		TOTAL EFETIVO			
					MOD	12		VIAS: 3
					MOI	1		DINF: 2
					TOTAL	13		EMPRESA: 1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 03		
						DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-02
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93603

ABIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 900043A
Data: 14/06/2021

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
		DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX						
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 069	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	08/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	69	296	PERÍODO:	Junho		
ESCOPO					SEMANA:	terça-feira		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Execução das instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais							
1.2	Execução das instalações elétricas							
1.3	Instalação do Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p							
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	2	0	2	18,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				
	0	0	0	0,00				
TOTAL	12	0	12	108,00				
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIARIAS		TOTAL	1	0	1
				0,00				
					TOTAL EFETIVO	12		3
					MOD	1		2
					MOI	13		1
					TOTAL			
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº	03	
						DATA:	14/06/2021	

MV ENGENHARIA
CNPJ: 23.564.382/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

MICHAEL SOTERO CARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 698045BA

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX									
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 070		
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	REstante	DATA:	09/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	70	295	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO					SEMANA:	quarta-feira			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00			
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feia			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE			
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução das instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais								
1.2	Execução das instalações elétricas								
1.3	Instalação do Forro em régua de pvc, frísado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	2	0	2	18,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	12	0	12	108,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1	0,00
			0,00		TOTAL EFETIVO	12			
					MOD	12			3
					MOI	1			2
					TOTAL	13			EMPRESA 1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 03			
					Planejamento	DATA: 14/06/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 31.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93070

ADRIEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 606048A
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX									
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 071		
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	PERÍODO:	DATA: 10/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	71	294	SEMANA:	Junho			
ESCOPO					HORÁRIO: 07:00 as 17:00				
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.									
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE			
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução das instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais								
1.2	Execução das instalações elétricas								
1.3	Instalação do Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p								
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA					MOI - MÃO DE OBRA INDIRETA				
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	2	0	2	18,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apointador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	12	0	12	108,00					0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1	0,00
				0,00	TOTAL EFETIVO	12			
					MOD	12		VIAS:	3
					MOI	1		DINF	2
					TOTAL	13		EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 03			
					Planejamento	DATA: 14/06/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

ACIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA		
		DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX							
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021		
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 072		
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	RESTANTE	DATA:	11/06/21			
31/03/2021	31/03/2022	365	72	293	PERÍODO:	Junho			
ESCOPO					SEMANA:	sexta-feira			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00			
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO			
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta			
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00			
NOITE						Sexta Feira			
						07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE			
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.								
1.1	Execução das instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais								
1.2	Execução das instalações elétricas								
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA									
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia	Horas
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0	0,00
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1	0,00
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0	0,00
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0	0,00
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0	0,00
Eletricista	2	0	2	18,00	Aux. Administ.	0	0	0	0,00
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0	0,00
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0	0,00
Serralheiro	0	0	0	0,00					0,00
	0	0	0	0,00					0,00
TOTAL	12	0	12	108,00	TOTAL	1	0	1	0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL EFETIVO	CONTROLE - CQ			
				0,00	MOD	12	VIAS: 3		
					MOI	1	DINF: 2		
					TOTAL	13	EMPRESA: 1		
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF				
ASS:					ASS:				
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX				
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor: Planejamento	Reg. Fotográfico - Nº 03			
						DATA: 14/06/2021			

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93053

ABIMAELO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 906045A
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 073	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	REstante	DATA:	12/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	73	292	PERÍODO:	Junho		
ESCOPO					SEMANA:	sábado		
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.					HORÁRIO:	07:00 as 17:00		
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHÃ	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feira		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Execução das instalações elétricas							
1.2	Requadramento e acabamento interno							
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	2	0	2	18,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	1	0	1	9,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	2	0	2	18,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				0,00
TOTAL	5	0	5	45,00				0,00
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1
				0,00	TOTAL EFETIVO			0,00
					MOD	5	VIAS:	3
					MOI	1	DINF	2
					TOTAL	6	EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 03		
					Planejamento	DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-63
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93653

ABIMAR SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604BA
MATRÍCULA: 7851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
		DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX						
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 074	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	REstante	PERÍODO:	13/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	74	291	SEMANA:	Junho		
					HORÁRIO:	domingo		
					07:00 as 17:00			
ESCOPO								
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.								
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feirã		
					07:00 hs as 17:00			
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	A contratada informa que não trabalhamos no dia 13/06/21							
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	1	0	1
Pedreiro	3	0	3	27,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	1	0	1	9,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	1	0	1	9,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	0	0	0	0,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	1	0	1
Serralheiro	0	0	0	0,00				
	0	0	0	0,00				
TOTAL	10	0	10	90,00				
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	3	0	3
			0,00					
					TOTAL EFETIVO	3	0	3
					MOD	10	VIAS:	3
					MOI	3	DINF	2
					TOTAL	13	EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 03		
						DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93022

ARMAR SOTERO CARBOSA
Carg. Engenheiro Civil
CREA: 93048A
R.CULA 1851

XIQUE-XIQUE		RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					MV ENGENHARIA	
DINF - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - PMXX								
EMPRESA:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					Contrato Nº	080/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA.					RDO Nº:	RDO-DINF-M.V.ENG. 075	
INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	DECORRIDOS	REstante	PERÍODO:	DATA: 14/06/21		
31/03/2021	31/03/2022	365	75	290	SEMANA:	Junho		
ESCOPO					HORÁRIO: 07:00 as 17:00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NO HOSPITAL JULIETA VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE / BA.								
CONDIÇÕES DO TEMPO	BOM	CHUVA SEM CONDIÇÕES DE MONTAGEM	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO	HORAS PARALISADAS	REGIME DE TRABALHO		
MANHA	X				0,00	Segunda a Quinta		
TARDE	X				0,00	07:00 hs as 17:00		
NOITE						Sexta Feia		
						07:00 hs as 17:00		
ITEM	GERENCIAMENTO e PLANEJAMENTO (ANDAMENTOS e OCORRÊNCIAS)					ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DIRE		
1	TRABALHO REALIZADO EM CAMPO - CANTEIRO DE OBRA INSTALADO NA RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA.							
1.1	Execução das instalações elétricas							
1.2	Requadramento e acabamento interno							
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
MOD - MÃO DE OBRA DIRETA								
Função	Efetivo Nom.	Faltas	Efetivo do dia	Horas	Função	Efetivo Nominal	Faltas	Efetivo do dia
Ajudante	5	0	5	45,00	Gerente - Obra	0	0	0
Pedreiro	2	0	2	18,00	Fiscal - Obra	1	0	1
Armador	0	0	0	0,00	T. de Segurança	0	0	0
Carpinteiro	0	0	0	0,00	A. de Planejamento	0	0	0
Pintor	0	0	0	0,00	Estagiário Eng.	0	0	0
Eletricista	2	0	2	18,00	Aux. Administ.	0	0	0
Encanador	0	0	0	0,00	Motorista	0	0	0
Encarregado	0	0	0	0,00	Apontador	0	0	0
Serralheiro	0	0	0	0,00				
TOTAL	9	0	9	81,00				
EQUIPAMENTOS	QT	AQUISIÇÃO	DIÁRIAS		TOTAL	1	0	1
				0,00	TOTAL EFETIVO			
					MOD	9	VIAS:	3
					MOI	1	DINF	2
					TOTAL	10	EMPRESA	1
RESPONSÁVEL - OBRA:					FISCALIZAÇÃO - DINF			
ASS:					ASS:			
RESPONSÁVEIS - EMPRESA CONTRATADA					RESPONSÁVEL - DINF/PMXX			
Revisão:	Elaborado Por: MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS				Setor:	Reg. Fotográfico - Nº 03		
						DATA: 14/06/2021		

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.664.387/0001-63
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 935...

MICHAEL SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 906046A
MATRÍCULA: 7851

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		REL. Nº:	003/06
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX		DATA:	14/06/2021
	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF		FOLHA	01/09

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA RESP. TÉC: MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES CONTRATO: 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA

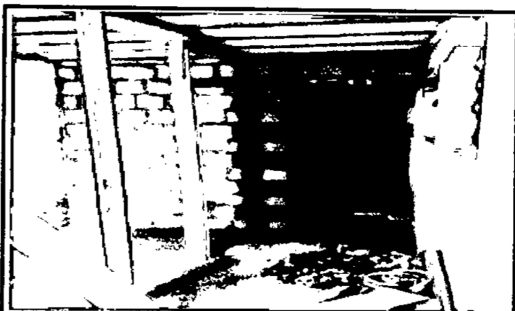


FOTO 01 - EXECUÇÃO DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO



FOTO 02 - EXECUÇÃO DO CHAPISCO E REBOCO



FOTO 03 - EXECUÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM



FOTO 04 - EXECUÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

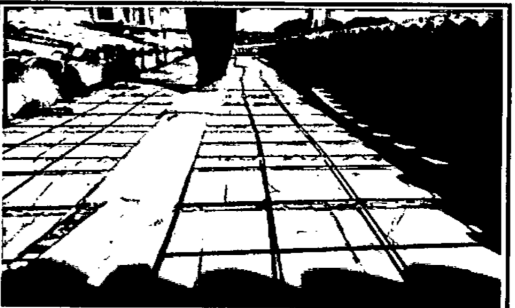


FOTO 05 - EXECUÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM



FOTO 06 - EXECUÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

ARMANDO SOTERO BARBOSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 010571
MATRÍCULA: 1881

M.V. ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		REL. Nº:	003/06
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX		DATA:	14/06/2021
	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF		FOLHA	02/09

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA **RESP. TÉCN:** MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES **CONTRATO:** 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA



FOTO 07 - EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.



FOTO 08 - EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

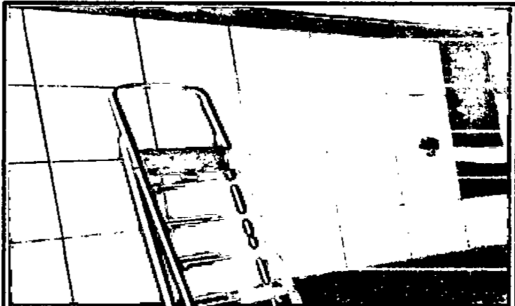


FOTO 09 - EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.




FOTO 10 - EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014



FOTO 11 - EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM




FOTO 12 - EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM

ABIMAELO SOARES CARVALHO
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 906.043/A
MATR: 906.043/A

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.864.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF	REL. Nº:	003/06
		DATA:	14/06/2021
		FOLHA	03/09

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA CRESP. TÉC: MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES I CONTRATO: 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA

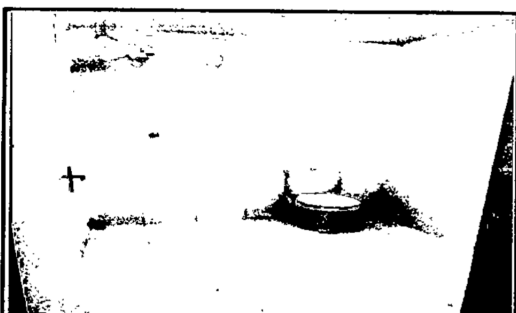


FOTO 13 - EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AE 06/2014



FOTO 14 - EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AE 06/2014

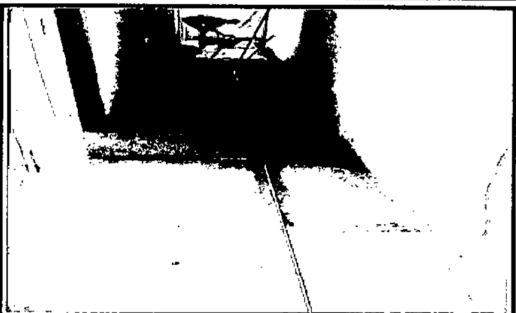


FOTO 15 - EXECUÇÃO DO PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO



FOTO 16 - EXECUÇÃO DO PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO



FOTO 17 - EXECUÇÃO DO PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO



FOTO 18 - EXECUÇÃO DO PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO

ABIMAELO SUTERO BATISTA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90804BA
MATRÍCULA: 7851

M.V. ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec: Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		REL. Nº:	003/06
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX		DATA:	14/06/2021
	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF		FOLHA	04/09

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DRESP. TÉC: MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES I CONTRATO: 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA

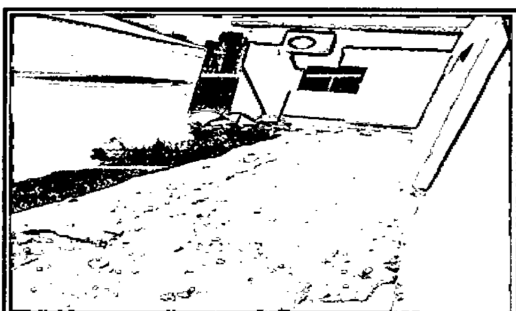


FOTO 19 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

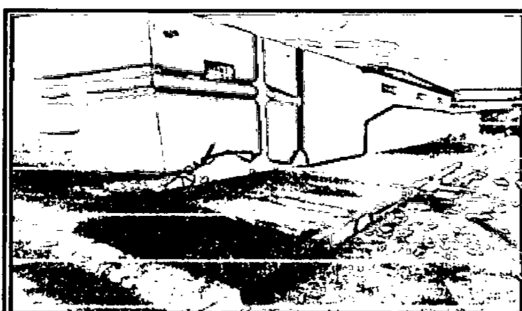


FOTO 20 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

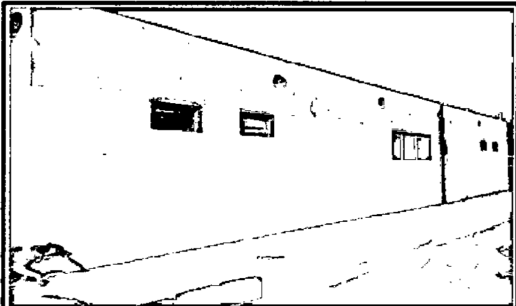


FOTO 21 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

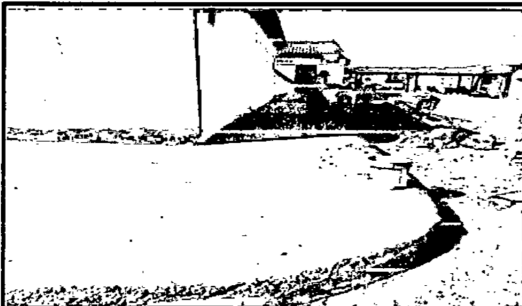


FOTO 22 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016



FOTO 23 - EXECUÇÃO DA GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

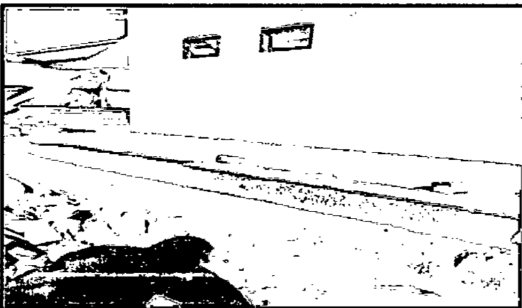


FOTO 24 - EXECUÇÃO DA GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

ABIMAELO SOFERO DA ROSA
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 966048A
MATRÍCULA: 7851

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.564.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF	REL. Nº:	003/06
		DATA:	14/06/2021
		FOLHA	05/09

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA CRESP. TÉC: MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES I CONTRATO: 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA

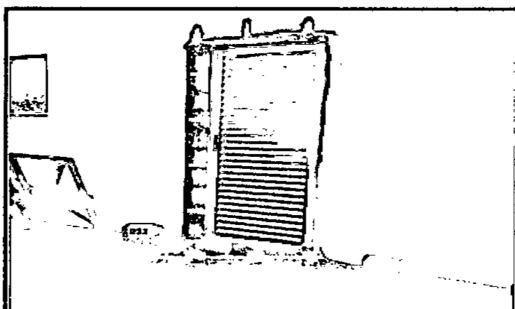


FOTO 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AE 12/2019




FOTO 26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AE 12/2019

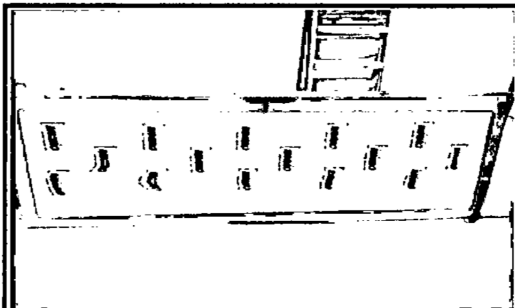


FOTO 26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS EM MADEIRA



FOTO 27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS EM MADEIRA




FOTO 27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO BASCULANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS

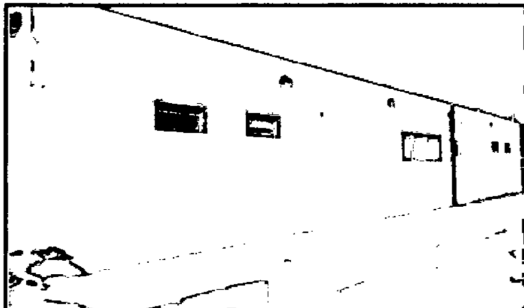



FOTO 28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO BASCULANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS


 ACIMAÉL BOTELHO BARROSO
 Cargo: Engenheiro Civil
 CREA: 908047A
 MATRÍCULA: 7651

M.V. ENGENHARIA
 CNPJ: 32.564.387/0001-68
 Resp. Téc. Michael A. Vargas
 Eng. Civil CREA/BA: 93058

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		REL. Nº:	003/06
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX		DATA:	14/06/2021
	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF		FOLHA	06/09

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA **RESP. TÊC:** MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES **CONTRATO:** 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA

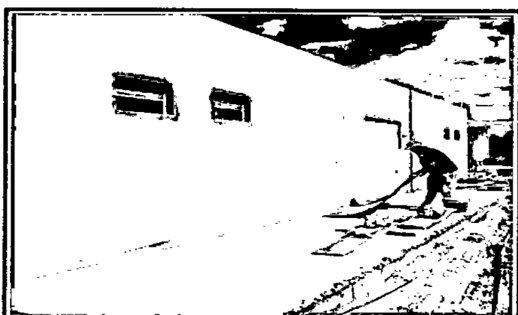


FOTO 29 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014



FOTO 30 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

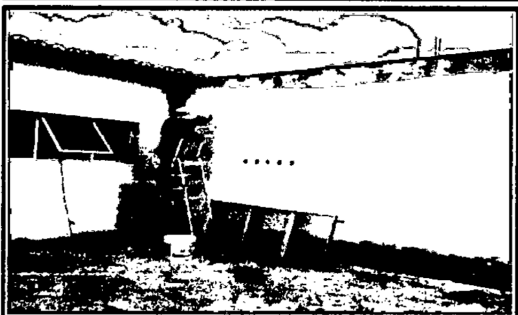


FOTO 31 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01

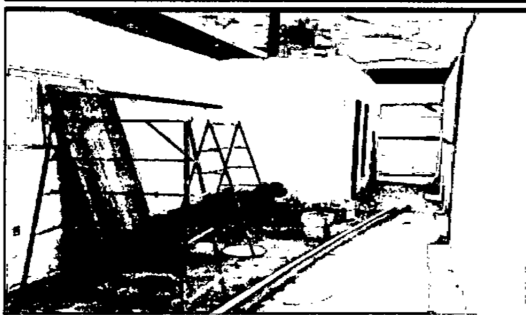


FOTO 32 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01

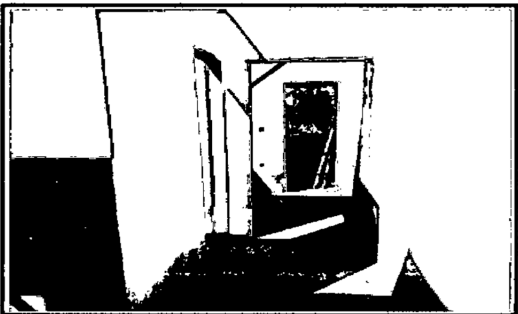


FOTO 33 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01

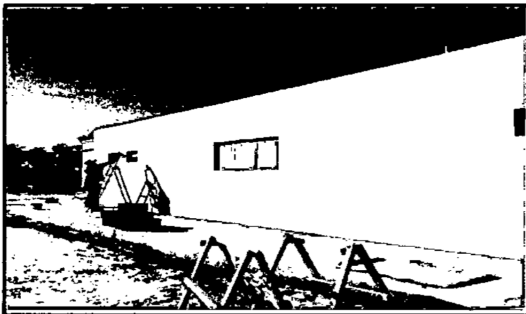



FOTO 34 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014


ABELARDO SOTERO EIRELI
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 906048A
MATR. CREA: 7851


M.V. ENGENHARIA
CNPJ: 33.563/387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		REL. Nº:	003/06
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX		DATA:	14/06/2021
	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF		FOLHA	07/09

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA **RESP. TÊC:** MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES **CONTRATO:** 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA




FOTO 35 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014




FOTO 36 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



FOTO 37 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAIS.



FOTO 38 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAIS.

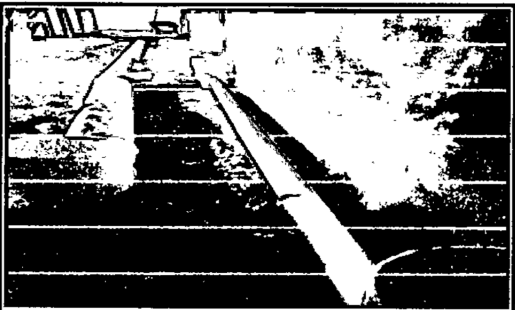


FOTO 39 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAIS.

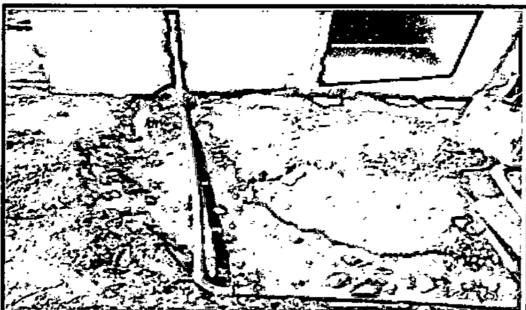


FOTO 40 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAIS.

ADIMAR SOTERO CARVALHO
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 005048A
MATRÍCULA: 7051

MV ENGENHARIA
CNPJ: 33.594.387/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		REL. Nº:	003/06
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX		DATA:	14/06/2021
	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF		FOLHA	08/09

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA **CRESP. TÉC:** MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES **CONTRATO:** 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA



FOTO 41 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAIS.




FOTO 42 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAIS.




FOTO 43 - EXECUÇÃO CAIXA DE PASSAGEM

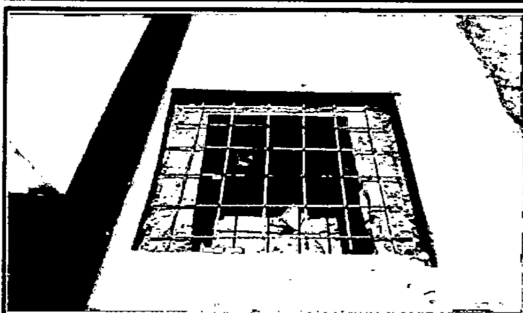


FOTO 44 - EXECUÇÃO CAIXA DE PASSAGEM

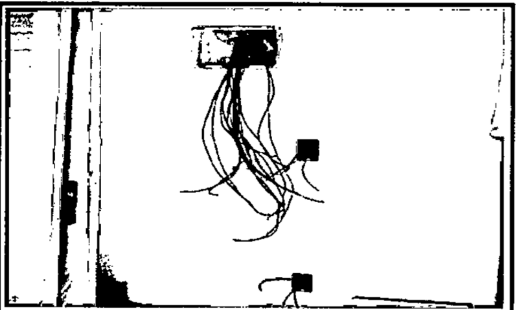



FOTO 45 - LANÇAMENTO E INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO.



FOTO 46 - LANÇAMENTO E INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO.


ADMAEL SOTERO SARTORI
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 93504BA
MATRÍCULA: 7351


M.V. ENGENHARIA
CNPJ: 33.684.367/0001-68
Resp. Tec. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058

	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		REL. Nº:	003/06
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CONTRATO DINF/PMXX		DATA:	14/06/2021
	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF		FOLHA	09/09

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA **RESP. TÉC:** MICHAEL A. VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 20 UNIDADES **CONTRATO:** 080/2021
LOCAL/OBRA: RUA EROTIDES NOGUEIRA, CENTRO DE XIQUE-XIQUE/BA



FOTO 47 - EXECUÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FIXAMENTO. AF_07/2019



FOTO 48 - EXECUÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FIXAMENTO. AF_07/2019



FOTO 49 - EXECUÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FIXAMENTO. AF_07/2019

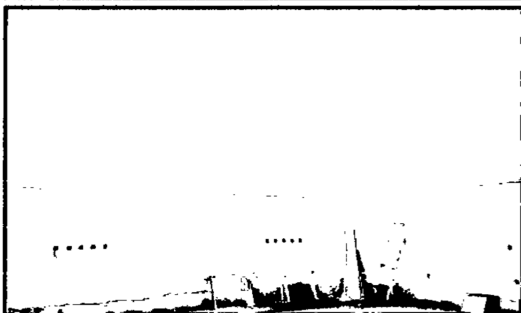


FOTO 50 - EXECUÇÃO DO FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

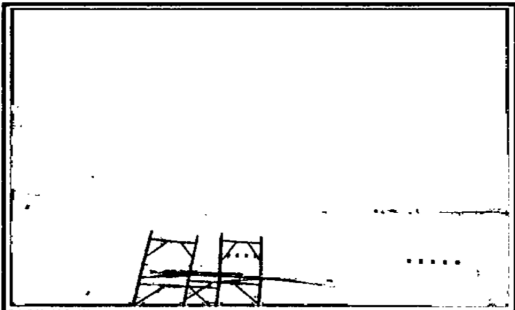




FOTO 51 - EXECUÇÃO DO FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P



FOTO 52 - EXECUÇÃO DO FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P


ARISMAEL SOTERO
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 90604DA
MATRÍCULA: 7657


M.V. ENGENHARIA
CNPJ: 33.664.387/0001-68
Resp. Loc. Michael A. Vargas
Eng. Civil CREA/BA: 93058



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210498455

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0513626530
Registro: 93058BA

Empresa contratada: **M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Registro: 0010147225-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Xique-Xique**

PRAÇA Dom Máximo

Complemento:

Cidade: **XIQUE-XIQUE**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.880.257/0001-27**
Nº: **384**

CEP: **47400000**

Contrato: **080/2021**

Valor: **R\$ 316.745,08**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Celebrado em: **31/03/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA R. Erotides Nogueira

Complemento: **Hospital Julieta Viana**

Cidade: **XIQUE-XIQUE**

Data de Início: **01/04/2021**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Xique-Xique**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

Código: **Não Especificado**

Nº: **703**

CEP: **47400000**

Coordenadas Geográficas: **-10.832078, -42.732087**

CPF/CNPJ: **13.880.257/0001-27**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA

111 - Execução de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO

316 - Demolição > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #810 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS CANALIZADO EM EDIFICAÇÕES

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL

Quantidade

Unidade

479,00

m2

264,96

m2

11,50

m³

152,06

m2

201,00

pontos

61,00

pontos

23,95

m2

23,95

m2

21,20

m³

1,00

pontos

6,30

m³

479,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONST. E REFORMA PROVISÓRIA DE 20UND'S DE TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI INTENSIVO AO COMBATE DO COVID-19.

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3x1Wb
Impresso em: 12/04/2021 às 14:10:40 por: , ip: 177.93.221.34

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Página 2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210498455

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

2021 *14* de *Junho* de *2021*
Local data

Michael Assunção Vargas
MICHAEL ASSUNÇÃO VARGAS - CPF: 037.292.065-23

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - CNPJ: 13.880.257/0001-27

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 09/04/2021 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 52841582

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3x1Wb
Impresso em: 12/04/2021 às 14:10:40 por: ip: 177.83.221.34

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210501830

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABIMAELO SOTERO BARBOSA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0513170570

Registro: 90604BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**

PRAÇA DOM MÁXIMO

Complemento:

Cidade: **Xique-Xique**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.880.257/0001-27**

Nº: **384**

CEP: **47400000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Erotides Nogueira

Complemento: **Hospital Julieta Viana**

Cidade: **XIQUE-XIQUE**

Data de início: **01/04/2021**

Previsão de término: **31/03/2022**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

Nº: **703**

CEP: **47400000**

Coordenadas Geográficas: **-10.832078, -42.732087**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**

CPF/CNPJ: **13.880.257/0001-27**

4. Atividade Técnica

13 - Fiscalização

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade

Unidade

11,50

m³

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

264,96

m²

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA

61,00

pontos

121 - Fiscalização de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.

201,00

pontos

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

479,00

m²

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS

23,95

m²

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

6,30

m³

316 - Demolição > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

21,20

m³

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL

479,00

m²

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #810 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS CANALIZADO EM EDIFICAÇÕES

1,00

un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO

23,95

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Construção e reforma para instalação de 20 Unidades de Tratamento Intensivo e Semi Intensivo. Ref. CT080/2021.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: YbATZ
Impresso em: 08/08/2021 às 16:23:36 por: , ip: 179.198.13.1

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@crea-ba.org.br
Fax: (71) 3453-8998



Página 2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210501830

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

MICHAEL SOTERO BARBOSA - CPF: 004.776.035-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE - CNPJ: 13.880.257/0001-27

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 16/04/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 52912575

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YbA7Z
Impresso em: 08/06/2021 às 16:23:36 por: ip: 179.198.13.1

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989



Firefox_

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?token...>



Emissão de comprovantes

G3341910215546211
19/08/2021 10:27:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.29

1171101171 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 18.686-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2328-0 - IRECE - BA

CONTA: 13.000.805-0

FAVORECIDO: M. V. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRE

CPF/CNPJ: 33.564.387/0001-68

VALOR: R\$ 62.658,48

DEBITO EM: 19/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 3.3D2.44A.7D6.2A2.7D6



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

AGOSTO/2021

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome:	M. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CNPJ/CPF:	33564387000168
RG:		Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA SILVA JARDIM	Cidade:	Xique-Xique
Banco:		UF:BA	
		Conta:	

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 023 - 3ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE ESPAÇO DO HOSPITAL JULIETA VIANA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) E SEMI INTENSIVO PARA ADOÇÃO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE., CARTA CONVITE Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 080/2021.

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$		Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	505,31	001	11711	186864	001	62.658,48
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	505,31					
Valor Líquido R\$	62.658,48	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 62.658,48 (SESSENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE, BA

19 de

Agosto

de 2021

Recebedor

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS (DEMONSTRATIVO DE RECEITAS 8 - AGOSTO/2021)



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE

Boletim Diário de Arrecadação

AGOSTO/2021

Conta: BB AG 11711 C/C - 24685-9 - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA

Emissão: 16/08/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: Banco do Brasil

Conta Corrente: 246859

Fonte: Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Contribuinte:

Especificação da Receita

Proc.	Receita	Emenda	C.C.	Valor
148	171812110100 - Bloco da Proteção Social Básica			5.590,00
149	171812110100 - Bloco da Proteção Social Básica			6.300,00

ONZE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

11.890,00

17/08/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G334171016582566008
17/08/2021 10:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 24685-9 BLOCO PROTECAO S BASICA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2021		+ Recebimento Fornecedor	9.434.001.500.043	5.590,00 C	
16/08/2021		+ Recebimento Fornecedor	9.434.001.500.045	6.300,00 C	
16/08/2021		BB CP Automatico S P	70	11.890,00 D	0,00 C
17/08/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	25.671,10 C
Saldo	25.671,10 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021

Saldo de fundos de investimento

S Público Automático	R\$ 25.671,10
----------------------	---------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536720 OSVALDO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/08/2021

Data de Atualização
17/08/21 07:18

Poder

Executivo

Órgão Pagador

Todos

Recebedor

Finas De Xique-Xique

Nº do Empenho

Todos

Data do Pagamento

02/07/2021 12/08/2021

Limpar Seleção

Seja Bem-vindo

Microsoft Power BI

www.transparencia.ba.gov.br/Pagamentos/Painel

Microsoft Power BI

Clique aqui para voltar à página anterior neste relatório

Tabela

Gráfico

Poder Executivo	Função Assistência Social	Elemento da Despesa Contribuições	Valor Empenhado R\$ 16.610,00
Órgão Secretaria De Justiça, Direitos Humanos E Desenvolvimento Social	Sub Função Vigilância Epidemiológica	Sub Elemento da Despesa Contribuições - Outros Ajustes (CDD)	Valor Liquidado R\$ 5.590,00
Unidade Orçamentária Fundo Estadual De Assistência Social	Programa do Governo Segurança Pública e Defesa Social	Modalidade de Licitação	Valor Pago R\$ 5.590,00
Recebedor Finas De Xique-Xique	Ação do Programa do Governo Apoio a Ações de Combate à Pandemia da Covid-19	Tipo do Processo Licitatório	Contrato, AFM ou APS
CNPJ ou CPF CNPJ - 13.582.852/0001-86	Número Processo SEI		
Nº da Liquidação 1260200012100046995	Tipo do Pagamento Pagamento Principal	Credor Finas De Xique-Xique	Data do Pagamento 12/08/2021
Total			Valor do Pagamento R\$ 5.590,00


Histórico

Pbv(Scfv) Parcela R\$ 2.795,00 Janeiro E Fevereiro/2021.

< Páginas >

1/1

Microsoft Power BI



Tabela

Gráfico

Data de Atualização
17/08/21 07:18

Poder

Executivo

Órgão Pagador

Todos

Recebedor

Fmas De Xique-Xique

Nº do Empenho

Todos

Data do Pagamento

02/07/2021 12/08/2021

Limpar Seleção

Saiba como Usar

Poder	Função	Elemento da Despesa	Valor Empenhado
Executivo	Assistência Social	Contribuições	R\$ 16.610,00
Órgão	Sub Função	Sub Elemento da Despesa	Valor Liquidado
Secretaria De Justiça, Direitos Humanos E Desenvolvimento Social	Vigilância Epidemiológica	Contribuições - Outros Ajustes (CDD)	R\$ 6.300,00
Unidade Orçamentária	Programa do Governo	Modalidade de Licitação	Valor Pago
Fundo Estadual De Assistência Social	Segurança Pública e Defesa Social		R\$ 6.300,00
Recebedor	Ação do Programa do Governo	Tipo do Processo Licitatório	
Fmas De Xique-Xique	Apoio a Ações de Combate à Pandemia da Covid-19		
CNPJ ou CPF	Número Processo SEI		
CNPJ - 13.582.852/0001-86			
Nº da Liquidação	Tipo do Pagamento	Credor	Data do Pagamento
1260200012100046979	Pagamento Principal	Fmas De Xique-Xique	12/08/2021
Total			R\$ 6.300,00

Histórico

Pbi(Paif) Parcela R\$ 3.150,00 Janeiro E Fevereiro/2021.

Microsoft Power BI

www.transparencia.ba.gov.br/Pagamentos/Painel

Páginas



1/1
